



RELATÓRIOS FINAIS

UNIDADES GARÇA



MARIANA I



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO DE ENTREGA FINAL

RELATÓRIO

Nº 06

Rev. 00

CONTROLE DE GERENCIAMENTO DE OBRA

UNIDADE: MARIANA I

Efetivo Médio	QT
Arquitetura total	04
-	00

Incidentes	QT
CAF/SAF	00
Acumulado	00

Cronograma	Data Prevista
Início	13/06/2022
Término	13/07/2022

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL

SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RESPONSABILIDADES DE OBRA

MARIANA I

RELATÓRIO

Nº 06

Rev. 00

SBCD CAMINHOS DE DAMASCO		CONTROLE DE GERENCIAMENTO DE OBRA		
Nome:	Função:	Empresa:	Contatos	
Rafael Takeo	Engenheiro Civil (Gestor de obras e Projetos)	SBCD - Caminhos de Damasco	(11) 00000-0000	zn.engenharia@sbcd.org.br
Lucas Salzano Carloto Marcondes	Projetista (Fiscalização de obras)	SBCD - Caminhos de Damasco	(11) 00000-0001	zn.projetos@sbcd.org.br

ARQUITETURA TOTAL		EMPREITEIRO DE EXECUÇÃO DE OBRA		
Nome:	Função:	Empresa:	Contatos	
Paola Brito	Arquiteta(Gestora de obras e projetos)	ARQUITETURA TOTAL	(11) 930777653	arquiteta@arquiteturatotal.com.br
Matheus Maiolli	Auxiliar de engenharia(Fiscalização e acompanhamento de obra)	ARQUITETURA TOTAL	(11)940493051	operacional@arquiteturatotal.com.br
Daniela Gomes	Arquiteta(Projetos)	ARQUITETURA TOTAL	(11)957781068	reforma@arquiteturatotal.com.br

ARQUITETURA TOTAL		TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO		
Nome:	Função:	Empresa:	Contatos	
Luciano Bazani	Técnico de segurança(Fiscalização de segurança das obras)	ARQUITETURA TOTAL	(11) 981739082	tecnicodeseguranca@arquiteturatotal.com.br

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RESUMO DE SERVIÇOS DE OBRA

MARIANA I

RELATÓRIO

Nº 06

Rev. 00

Reparos do telhado/forro/elétrica e pintura

Local:	Serviço:	Empresa:	Status
Área externa	Troca pontual do madeiramento	Arquitetura total	Finalizado
Área externa	Troca pontual do tipo telhas romanas	Arquitetura total	Finalizado
Área interna	Reparos pontuais no forro de PVC	Arquitetura total	Finalizado
Área externa/interna	Reparos hidráulicos	Arquitetura total	Finalizado
Área interna	Troca de interruptores e tomadas	Arquitetura total	Finalizado
Área externa/interna	Reparos do quadro de luz e disjuntores	Arquitetura total	Finalizado
Área externa	Preparativos(como lixamento) e pintura geral externa	Arquitetura total	Finalizado
Área interna	Preparativos(como lixamento) e pintura geral interna	Arquitetura total	Finalizado
Área interna	Pintura pontual dos tetos, que estejam danificados	Arquitetura total	Finalizado
Área externa	Pintura pontual dos gradis externos, que estejam danificados	Arquitetura total	Finalizado

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL

SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

CRONOGRAMA DE OBRA

MARIANA I

RELATÓRIO

Nº 06

Rev. 00

TAREFA	ATRIBUÍDO PARA	PROGRESSO	INÍCIO	TÉRMINO
REPAROS TELHADO				
Vistoria do madeiramento	CIVIL	100%	13/6/22	13/6/22
Troca pontual do madeiramento	CIVIL	100%	14/6/22	15/6/22
Vistoria das telhas tipo romana	CIVIL	100%	15/6/22	15/6/22
Troca pontual das telhas tipo romana	CIVIL	100%	16/6/22	17/6/22
REPAROS GERAIS				
Vistoria nas área de forro	CIVIL	100%	17/6/22	17/6/22
Reparos pontuais no forro de PVC existente	CIVIL	100%	20/6/22	20/6/22
substituição pontual do forro de PVC	CIVIL	100%	21/6/22	22/6/22
Pequenos reparos hidráulicos	HIDRÁULICA	100%	23/6/22	24/6/22

TAREFA	ATRIBUÍDO PARA	PROGRESSO	INÍCIO	TÉRMINO
ELÉTRICA				
Reparos em interruptores e tomadas	ELÉTRICA	100%	27/6/22	28/6/22
Reparos no Q.L e disjuntores	ELÉTRICA	100%	29/6/22	30/6/22
CLCB	ELÉTRICA	100%	11/7/22	13/7/22
SPDA	ELÉTRICA	100%	9/7/22	12/7/22
PINTURA				
Pintura geral externa	PINTURA	100%	17/6/22	10/7/22
Pintura geral interna	PINTURA	100%	4/7/22	11/7/22
Pintura pontual dos tetos, que estejam danificados	PINTURA	100%	29/6/22	10/7/22
Pintura pontual dos gradis externos, que estejam danifi	PINTURA	100%	17/6/22	10/7/22
Limpeza geral da obra	LIMPEZA	100%	11/7/22	12/7/22
Insira novas linhas ACIMA desta				
ENTREGA FINAL	ARQ.TOTAL	100%	13/7/22	13/7/22

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL

SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

MARIANA I

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 06

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área externa	Vistoria inicial da unidade.	ARQUITETURA TOTAL	De 27/06/2022	Ate 27/06/2022



Vistoria inicial da unidade.



Vistoria inicial da unidade.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

MARIANA I
RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 06

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área externa	Vistoria inicial da unidade.	ARQUITETURA TOTAL	De 27/06/2022	Ate 27/06/2022



Vistoria inicial da unidade.



Vistoria inicial da unidade.



Vistoria inicial da unidade.

EMPREENHEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

MARIANA I

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 06

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área externa	Vistoria inicial da unidade.	ARQUITETURA TOTAL	De 27/06/2022	Ate 27/06/2022



Vistoria inicial da unidade.



Vistoria inicial da unidade.



Vistoria inicial da unidade.

EMPREENHEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

MARIANA I
RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 06

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área interna	Vistoria inicial da unidade.	ARQUITETURA TOTAL	De 27/06/2022	Ate 27/06/2022



Vistoria inicial da unidade.



Vistoria inicial da unidade.



Vistoria inicial da unidade.

EMPREENHEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

MARIANA I

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO


Nº 06

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área interna	Vistoria inicial da unidade.	ARQUITETURA TOTAL	De 27/06/2022	Ate 27/06/2022



Vistoria inicial da unidade.

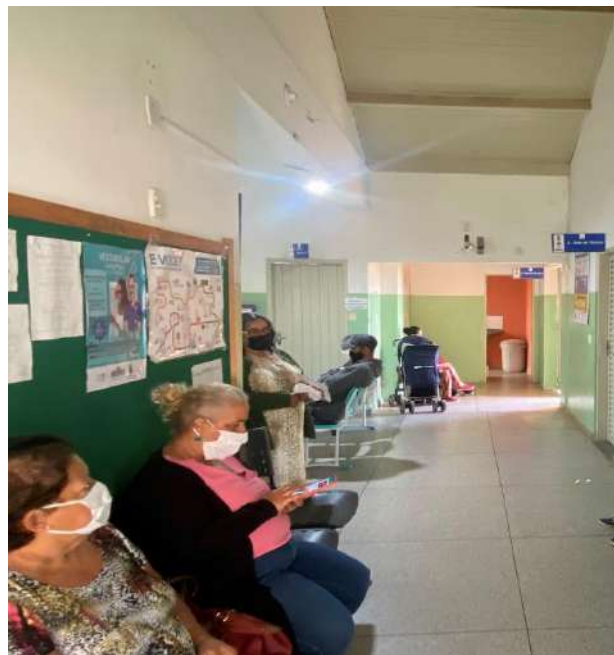

Vistoria inicial da unidade.



Vistoria inicial da unidade.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

MARIANA I

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 06

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área interna	Vistoria inicial da unidade.	ARQUITETURA TOTAL	De 27/06/2022	Ate 27/06/2022



Vistoria inicial da unidade.



Vistoria inicial da unidade.



Vistoria inicial da unidade.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

MARIANA I

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 06

Rev. 00


Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área interna	Vistoria inicial da unidade.	ARQUITETURA TOTAL	De 27/06/2022	Ate 27/06/2022



Vistoria inicial da unidade.



Vistoria inicial da unidade.

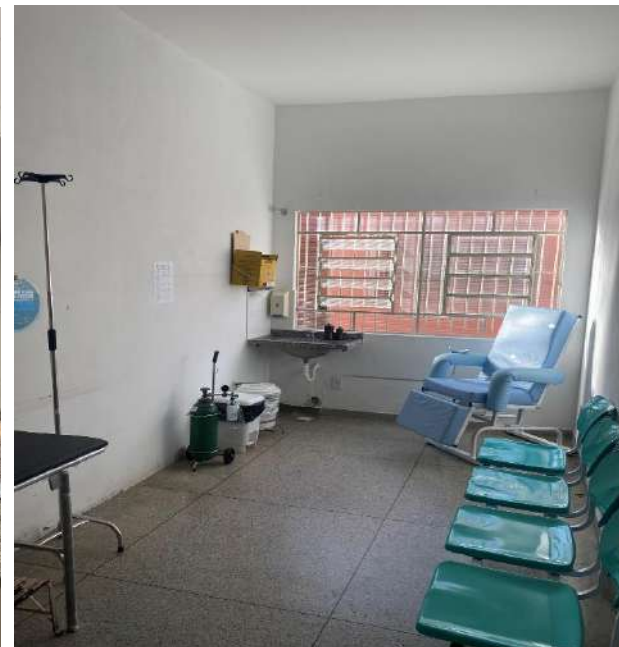

Vistoria inicial da unidade.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

MARIANA I

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 06

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área interna	Vistoria inicial da unidade.	ARQUITETURA TOTAL	De 27/06/2022	Ate 27/06/2022



Vistoria inicial da unidade.



Vistoria inicial da unidade.



Vistoria inicial da unidade.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

MARIANA I
RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO


Nº 06

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área interna	Vistoria inicial da unidade.	ARQUITETURA TOTAL	De 27/06/2022	Ate 27/06/2022



Vistoria inicial da unidade.

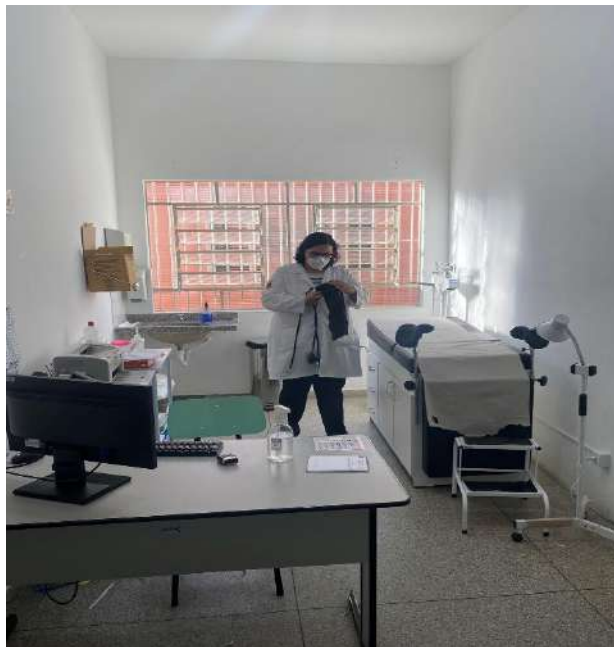

Vistoria inicial da unidade.



Vistoria inicial da unidade.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

MARIANA I
RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 06

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área externa	Começo dos preparativos para a pintura externa da unidade, como lixamento e colocação de ferros nas trincas existentes.	ARQUITETURA TOTAL	De 13/06/2022	Ate 17/06/2022



Começo dos preparativos para a pintura externa.



Começo dos preparativos para a pintura externa.



Começo dos preparativos para a pintura externa.

OBS: Na semana tivemos feriado, portanto a unidade não abriu nos dias 16 e 17.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

MARIANA I
RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 06

Rev. 01

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área externa	Começo dos preparativos para a pintura externa da unidade, como lixamento e colocação de ferros nas trincas existentes.	ARQUITETURA TOTAL	De 13/06/2022	Ate 17/06/2022



Começo dos preparativos para a pintura externa.



Começo dos preparativos para a pintura externa.



Começo dos preparativos para a pintura externa.

OBS: Na semana tivemos feriado, portanto a unidade não abriu nos dias 16 e 17.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

MARIANA I
RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 06

Rev. 01

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área externa	Começo dos preparativos para a pintura externa da unidade, como lixamento e colocação de ferros nas trincas existentes.	ARQUITETURA TOTAL	De 13/06/2022	Ate 17/06/2022



Começo dos preparativos para a pintura externa.



Começo dos preparativos para a pintura externa.



Começo dos preparativos para a pintura externa.

OBS: Na semana tivemos feriado, portanto a unidade não abriu nos dias 16 e 17.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

MARIANA I
RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 06

Rev. 01

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área externa	Começo dos preparativos para a pintura externa da unidade, como lixamento e colocação de ferros nas trincas existentes.	ARQUITETURA TOTAL	De 13/06/2022	Ate 17/06/2022



Começo dos preparativos para a pintura externa.



Começo dos preparativos para a pintura externa.



Começo dos preparativos para a pintura externa.

OBS: Na semana tivemos feriado, portanto a unidade não abriu nos dias 16 e 17.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

MARIANA I
RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 06

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área externa	Reparo das rachaduras externas, em cimento e ferro, e preparo para a área de pintura .	ARQUITETURA TOTAL	De 17/06/2022	Ate 24/06/2022



Reparo das rachaduras externas, em cimento e ferro, e preparo para a área de pintura .



Reparo das rachaduras externas, em cimento e ferro, e preparo para a área de pintura .



Reparo das rachaduras externas, em cimento e ferro, e preparo para a área de pintura .

EMPREENHEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

MARIANA I
RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 06

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área externa	Reparo das rachaduras externas, em cimento e ferro, e preparo para a área de pintura .	ARQUITETURA TOTAL	De 17/06/2022	Ate 24/06/2022



Reparo das rachaduras externas, em cimento e ferro, e preparo para a área de pintura .



Reparo das rachaduras externas, em cimento e ferro, e preparo para a área de pintura .



Reparo das rachaduras externas, em cimento e ferro, e preparo para a área de pintura .

EMPREENHEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

MARIANA I
RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 06

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área externa	Reparo das rachaduras externas, em cimento e ferro, e preparo para a área de pintura .	ARQUITETURA TOTAL	De 17/06/2022	Ate 24/06/2022



Reparo das rachaduras externas, em cimento e ferro, e preparo para a área de pintura .



Reparo das rachaduras externas, em cimento e ferro, e preparo para a área de pintura .



Reparo das rachaduras externas, em cimento e ferro, e preparo para a área de pintura .

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

MARIANA I
RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 06

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área externa	Reparo das rachaduras externas, em cimento e ferro, e preparo para a área de pintura .	ARQUITETURA TOTAL	De 17/06/2022	Ate 24/06/2022



Reparo das rachaduras externas, em cimento e ferro, e preparo para a área de pintura .



Reparo das rachaduras externas, em cimento e ferro, e preparo para a área de pintura .



Reparo das rachaduras externas, em cimento e ferro, e preparo para a área de pintura .

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

MARIANA I
RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 06

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área externa	Reparo das rachaduras externas, em cimento e ferro, e preparo para a área de pintura .	ARQUITETURA TOTAL	De 17/06/2022	Ate 24/06/2022



Reparo das rachaduras externas, em cimento e ferro, e preparo para a área de pintura .



Reparo das rachaduras externas, em cimento e ferro, e preparo para a área de pintura .



Reparo das rachaduras externas, em cimento e ferro, e preparo para a área de pintura .

EMPREENHEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

MARIANA I
RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 06

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área interna	Reparo das rachadura e aplicação da primeira mão de tinta .	ARQUITETURA TOTAL	De 24/06/2022	Ate 01/07/2022



Reparo das rachadura e aplicação da primeira mão de tinta .



Reparo das rachadura e aplicação da primeira mão de tinta .



Reparo das rachadura e aplicação da primeira mão de tinta .

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

MARIANA I
RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 06

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área externa	Reparo das rachaduras externas, em cimento e ferro, e preparo para a área de pintura .	ARQUITETURA TOTAL	De 24/06/2022	Ate 01/07/2022



Reparo das rachaduras externas, em cimento e ferro, e preparo para a área de pintura .



Reparo das rachaduras externas, em cimento e ferro, e preparo para a área de pintura .



Reparo das rachaduras externas, em cimento e ferro além da passagem de conduítes.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

MARIANA I
RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 06

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área interna	Passagem dos conduítes e troca das tomadas .	ARQUITETURA TOTAL	De 24/06/2022	Ate 01/07/2022



Passagem dos conduítes e troca das tomadas .



Passagem dos conduítes e troca das tomadas .



Passagem dos conduítes e troca das tomadas .

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

MARIANA I
RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO


Nº 06

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área interna	Reparo das rachaduras externas, em cimento e ferro, preparo para a área de pintura com massa corrida.	ARQUITETURA TOTAL	De 24/06/2022	Ate 01/07/2022



Reparo das rachaduras externas, em cimento e ferro, preparo para a área de pintura com massa corrida.

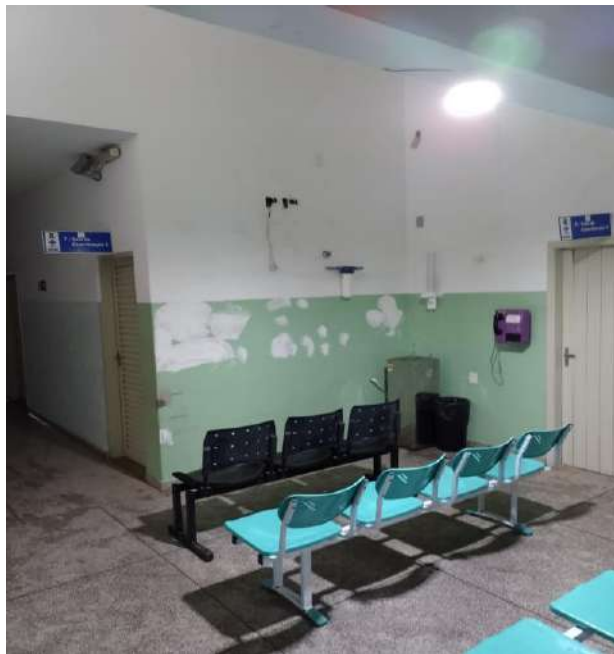

Reparo das rachaduras externas, em cimento e ferro, preparo para a área de pintura com massa corrida.



Reparo das rachaduras externas, em cimento e ferro, preparo para a área de pintura com massa corrida.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

MARIANA I
RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 06

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área interna	Reparo das rachaduras externas, em cimento e ferro, preparo para a área de pintura com massa corrida.	ARQUITETURA TOTAL	De 24/06/2022	Ate 01/07/2022



Reparo das rachaduras externas, em cimento e ferro, preparo para a área de pintura com massa corrida.



Reparo das rachaduras externas, em cimento e ferro, preparo para a área de pintura com massa corrida.



Reparo das rachaduras externas, em cimento e ferro, preparo para a área de pintura com massa corrida.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

MARIANA I
RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 06

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área externa	Reparo dos madeiramentos e telhas.	ARQUITETURA TOTAL	De 24/06/2022	Ate 01/07/2022



Reparo dos madeiramentos e telhas.



Reparo dos madeiramentos e telhas.



Reparo dos madeiramentos e telhas.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

MARIANA I
RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 06

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área externa	Reparo dos madeiramentos e telhas.	ARQUITETURA TOTAL	De 24/06/2022	Ate 01/07/2022



Reparo dos madeiramentos e telhas.



Reparo dos madeiramentos e telhas.



Reparo dos madeiramentos e telhas.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

MARIANA I
RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 06

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área externa	Reparo dos madeiramentos e telhas.	ARQUITETURA TOTAL	De 24/06/2022	Ate 01/07/2022



Reparo dos madeiramentos e telhas.



Reparo dos madeiramentos e telhas.



Reparo dos madeiramentos e telhas.

EMPREENHEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

MARIANA I
RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 06

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área externa	Reparo na parte hidráulica principalmente na caixa de água.	ARQUITETURA TOTAL	De 24/06/2022	Ate 01/07/2022



Reparo na parte hidráulica principalmente na caixa de água.



Reparo na parte hidráulica principalmente na caixa de água.



Reparo na parte hidráulica principalmente na caixa de água.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

MARIANA I
RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 06

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área externa	Reparo das rachaduras e manchas dos tetos e fachada .	ARQUITETURA TOTAL	De 01/07/2022	Ate 08/07/2022



Reparo das rachadura e manchas, tanto dos tetos quanto das paredes.



Reparo das rachadura e manchas, tanto dos tetos quanto das paredes.



Reparo das rachadura e manchas, tanto dos tetos quanto das paredes.

EMPREENHEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

MARIANA I
RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 06

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área externa	Reparo das rachaduras e manchas da fachada.	ARQUITETURA TOTAL	De 01/07/2022	Ate 08/07/2022



Reparo das rachaduras e manchas da fachada.



Reparo das rachaduras e manchas da fachada.



Reparo das rachaduras e manchas da fachada.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

MARIANA I
RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 06

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área externa	Reparo das rachaduras e manchas da fachada, além da instalação do SPDA.	ARQUITETURA TOTAL	De 01/07/2022	Ate 08/07/2022



Instalação do SPDA.



Instalação do SPDA.



Instalação do SPDA.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

MARIANA I
RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 06

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área interna	Aplicação de massa corrida e 1ª mão de pintura.	ARQUITETURA TOTAL	De 01/07/2022	Ate 08/07/2022



Aplicação de massa corrida e 1ª mão de pintura.



Aplicação de massa corrida e 1ª mão de pintura.



Aplicação de massa corrida e 1ª mão de pintura.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

MARIANA I
RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 06

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área interna	Aplicação de massa corrida e 1ª mão de pintura.	ARQUITETURA TOTAL	De 01/07/2022	Ate 08/07/2022



Aplicação de massa corrida e 1ª mão de pintura.



Aplicação de massa corrida e 1ª mão de pintura.



Aplicação de massa corrida e 1ª mão de pintura.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

MARIANA I
RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 06

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área interna	Aplicação de massa corrida e 1ª mão de pintura.	ARQUITETURA TOTAL	De 01/07/2022	Ate 08/07/2022



Aplicação de massa corrida e 1ª mão de pintura.



Aplicação de massa corrida e 1ª mão de pintura.



Aplicação de massa corrida e 1ª mão de pintura.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA


MARIANA I
RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO


Nº 06

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área interna	Aplicação de massa corrida e 1ª mão de pintura.	ARQUITETURA TOTAL	De 01/07/2022	Ate 08/07/2022

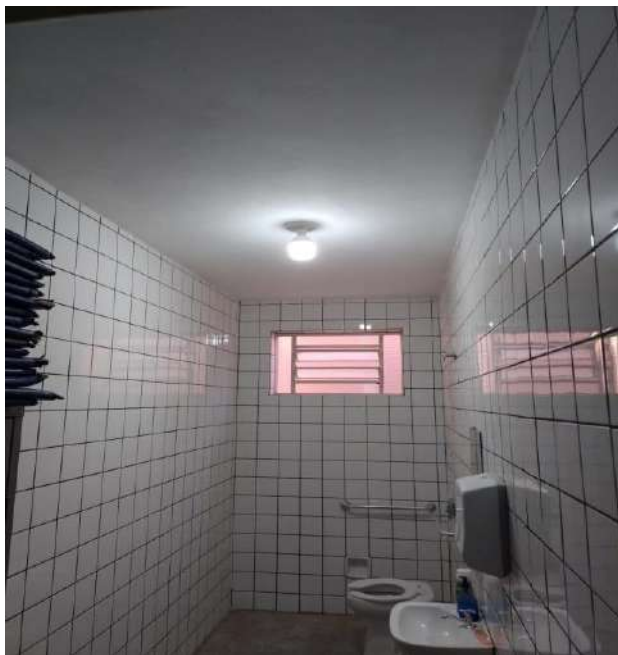

Aplicação de massa corrida e 1ª mão de pintura.

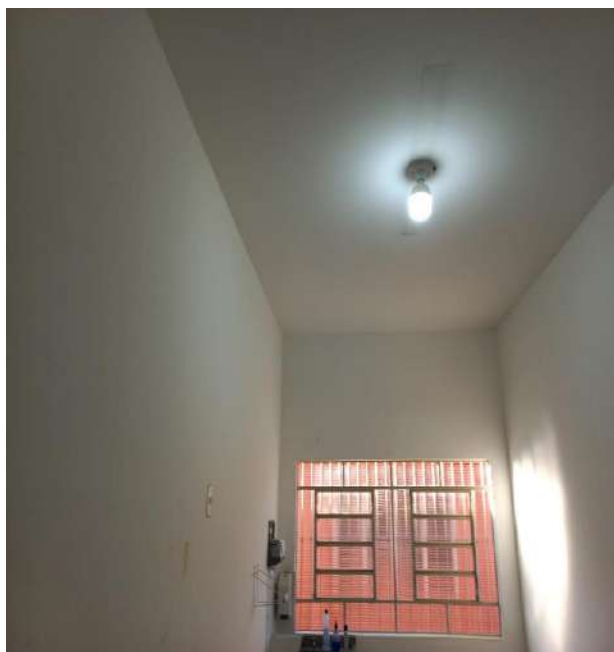

Aplicação de massa corrida e 1ª mão de pintura.



Aplicação de massa corrida e 1ª mão de pintura.

EMPREENHEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

MARIANA I
RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 06

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área interna	Aplicação de massa corrida e 1ª mão de pintura.	ARQUITETURA TOTAL	De 01/07/2022	Ate 08/07/2022



Aplicação de massa corrida e 1ª mão de pintura.



Aplicação de massa corrida e 1ª mão de pintura.



Aplicação de massa corrida e 1ª mão de pintura.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

MARIANA I
RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 06

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área interna	Aplicação de massa corrida e 1ª mão de pintura.	ARQUITETURA TOTAL	De 01/07/2022	Ate 08/07/2022



Aplicação de massa corrida e 1ª mão de pintura.



Aplicação de massa corrida e 1ª mão de pintura.



Aplicação de massa corrida e 1ª mão de pintura.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

MARIANA I
RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 06

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área interna	Reparos na parte hidráulica(troca de sifão e mangueiras e o desentupimento das encanações).	ARQUITETURA TOTAL	De 01/07/2022	Ate 08/07/2022



Reparos na parte hidráulica(troca de sifão e mangueiras e o desentupimento das encanações).



Reparos na parte hidráulica(troca de sifão e mangueiras e o desentupimento das encanações).



Reparos na parte hidráulica(troca de sifão e mangueiras e o desentupimento das encanações).

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

MARIANA I
RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 06

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área externa/Interna	Finalização da pintura externa e interna(paredes, caixilhos e tetos).	ARQUITETURA TOTAL	De 08/07/2022	Ate 15/07/2022



Finalização da pintura externa e interna(paredes, caixilhos e tetos).



Finalização da pintura externa e interna(paredes, caixilhos e tetos).



Finalização da pintura externa e interna(paredes, caixilhos e tetos).

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

MARIANA I
RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 06

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área externa/Interna	Finalização da pintura externa e interna(paredes, caixilhos e tetos).	ARQUITETURA TOTAL	De 08/07/2022	Ate 15/07/2022



Finalização da pintura externa e interna(paredes, caixilhos e tetos).



Finalização da pintura externa e interna(paredes, caixilhos e tetos).



Finalização da pintura externa e interna(paredes, caixilhos e tetos).

EMPREENHEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

MARIANA I
RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 06

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área externa/Interna	Finalização da pintura externa e interna(paredes, caixilhos e tetos).	ARQUITETURA TOTAL	De 08/07/2022	Ate 15/07/2022



Finalização da pintura externa e interna(paredes, caixilhos e tetos).



Finalização da pintura externa e interna(paredes, caixilhos e tetos).



Finalização da pintura externa e interna(paredes, caixilhos e tetos).

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

MARIANA I
RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO


Nº 06

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área externa/Interna	Finalização da pintura externa e interna(paredes, caixilhos e tetos).	ARQUITETURA TOTAL	De 08/07/2022	Ate 15/07/2022



Finalização da pintura externa e interna(paredes, caixilhos e tetos).

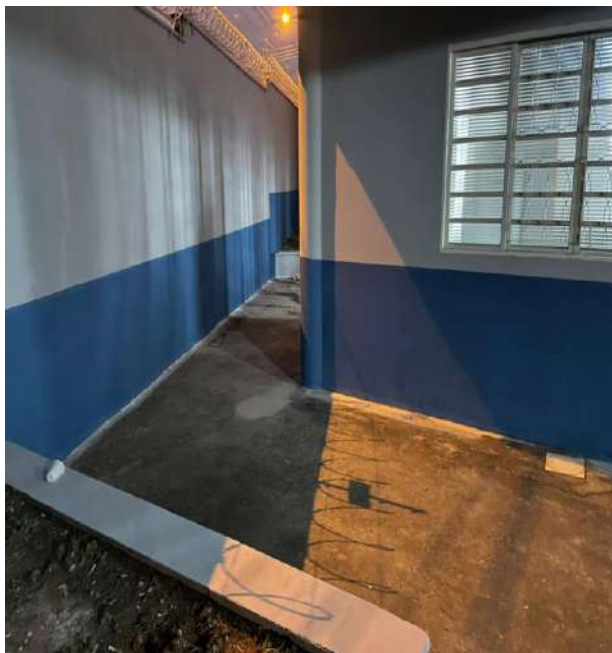

Finalização da pintura externa e interna(paredes, caixilhos e tetos).



Finalização da pintura externa e interna(paredes, caixilhos e tetos).

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

MARIANA I
RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 06

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área externa	Finalização da obra	ARQUITETURA TOTAL	De 15/07/2022	Ate 22/07/2022



Finalização da obra.



Finalização da obra.



Finalização da obra.

EMPREENHEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

MARIANA I
RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 06

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área externa	Finalização da obra	ARQUITETURA TOTAL	De 15/07/2022	Ate 22/07/2022



Finalização da obra.



Finalização da obra.



Finalização da obra.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

MARIANA I
RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 06

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área externa	Finalização da obra	ARQUITETURA TOTAL	De 15/07/2022	Ate 22/07/2022



Finalização da obra.



Finalização da obra.



Finalização da obra.

EMPREENHEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

MARIANA I
RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 06

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área externa	Finalização da obra	ARQUITETURA TOTAL	De 15/07/2022	Ate 22/07/2022



Finalização da obra.



Finalização da obra.



Finalização da obra.

EMPREENHEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

MARIANA I
RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 06

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área externa	Finalização da obra	ARQUITETURA TOTAL	De 15/07/2022	Ate 22/07/2022



Finalização da obra.



Finalização da obra.



Finalização da obra.

EMPREENHEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

MARIANA I
RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 06

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área externa	Finalização da obra	ARQUITETURA TOTAL	De 15/07/2022	Ate 22/07/2022



Finalização da obra.



Finalização da obra.



Finalização da obra.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

MARIANA I
RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 06

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área externa	Finalização da obra	ARQUITETURA TOTAL	De 15/07/2022	Ate 22/07/2022



Finalização da obra.



Finalização da obra.



Finalização da obra.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

MARIANA I
RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 06

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área externa	Finalização da obra	ARQUITETURA TOTAL	De 15/07/2022	Ate 22/07/2022



Finalização da obra.



Finalização da obra.



Finalização da obra.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

MARIANA I
RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 06

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área externa	Finalização da obra	ARQUITETURA TOTAL	De 15/07/2022	Ate 22/07/2022



Finalização da obra.



Finalização da obra.



Finalização da obra.

EMPREENHEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

MARIANA I
RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 06

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área externa	Finalização da obra	ARQUITETURA TOTAL	De 15/07/2022	Ate 22/07/2022



Finalização da obra.



Finalização da obra.



Finalização da obra.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

MARIANA I
RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO


Nº 06

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área externa	Finalização da obra	ARQUITETURA TOTAL	De 15/07/2022	Ate 22/07/2022



Finalização da obra.

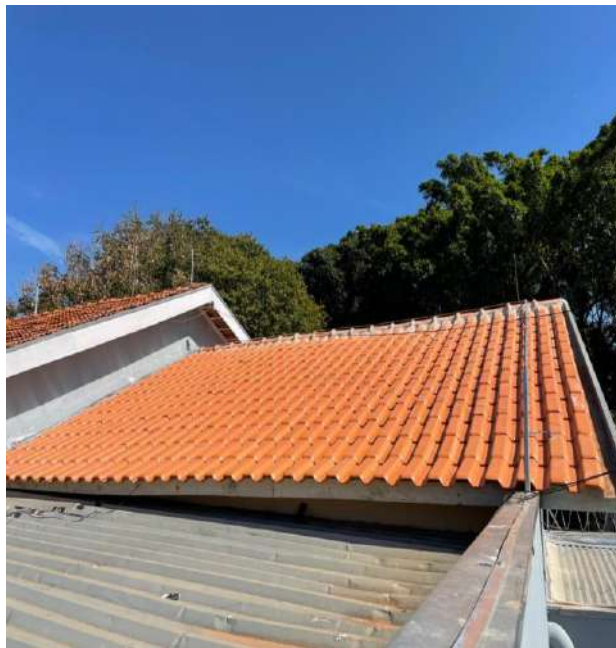

Finalização da obra.



Finalização da obra.

EMPREENHEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

MARIANA I
RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 06

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área interna	Finalização da obra	ARQUITETURA TOTAL	De 15/07/2022	Ate 22/07/2022



Finalização da obra.



Finalização da obra.



Finalização da obra.

EMPREENHEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

MARIANA I
RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 06

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área interna	Finalização da obra	ARQUITETURA TOTAL	De 15/07/2022	Ate 22/07/2022



Finalização da obra.



Finalização da obra.



Finalização da obra.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

MARIANA I
RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 06

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área interna	Finalização da obra	ARQUITETURA TOTAL	De 15/07/2022	Ate 22/07/2022



Finalização da obra.



Finalização da obra.



Finalização da obra.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

MARIANA I
RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 06

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área interna	Finalização da obra	ARQUITETURA TOTAL	De 15/07/2022	Ate 22/07/2022



Finalização da obra.



Finalização da obra.



Finalização da obra.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

MARIANA I
RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 06

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área interna	Finalização da obra	ARQUITETURA TOTAL	De 15/07/2022	Ate 22/07/2022



Finalização da obra.



Finalização da obra.



Finalização da obra.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

MARIANA I
RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 06

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área interna	Finalização da obra	ARQUITETURA TOTAL	De 15/07/2022	Ate 22/07/2022



Finalização da obra.



Finalização da obra.



Finalização da obra.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA


MARIANA I
RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 06

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área interna	Finalização da obra	ARQUITETURA TOTAL	De 15/07/2022	Ate 22/07/2022

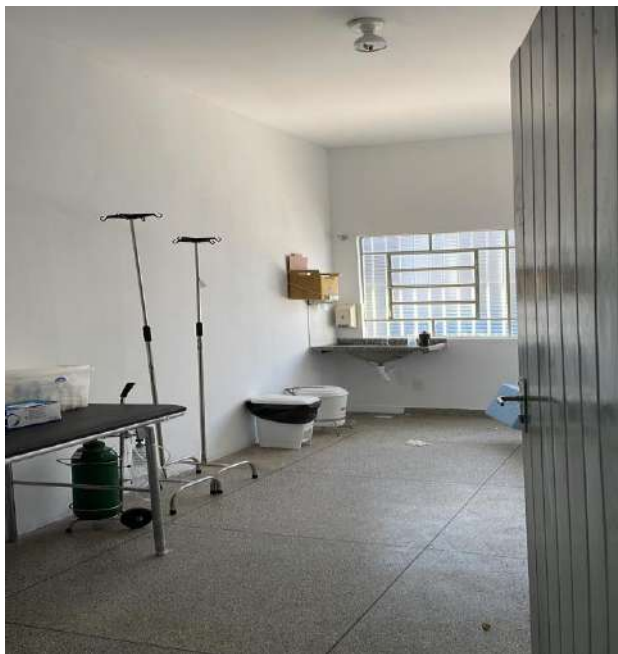

Finalização da obra.



Finalização da obra.



Finalização da obra.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

MARIANA I
RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO


Nº 06

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área interna	Finalização da obra	ARQUITETURA TOTAL	De 15/07/2022	Ate 22/07/2022



Finalização da obra.

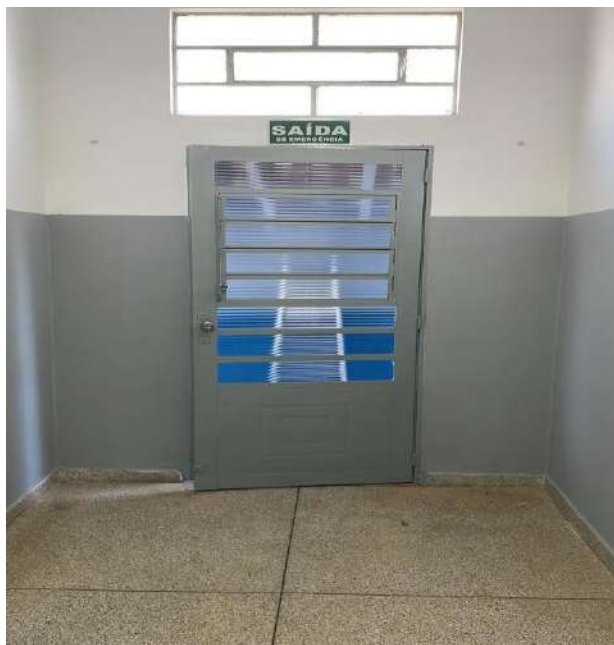

Finalização da obra.



Finalização da obra.

EMPREENHEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

MARIANA I
RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 06

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área interna	Finalização da obra	ARQUITETURA TOTAL	De 15/07/2022	Ate 22/07/2022



Finalização da obra.



Finalização da obra.



Finalização da obra.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

MARIANA I
RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 06

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área interna	Finalização da obra	ARQUITETURA TOTAL	De 15/07/2022	Ate 22/07/2022



Finalização da obra.



Finalização da obra.



Finalização da obra.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

MARIANA I
RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 06

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área interna	Finalização da obra	ARQUITETURA TOTAL	De 15/07/2022	Ate 22/07/2022



Finalização da obra.



Finalização da obra.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



EUCALIPTOS I E II + POLO



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO DE ENTREGA FINAL

RELATÓRIO

Nº 09

Rev. 00

CONTROLE DE GERENCIAMENTO DE OBRA

UNIDADE: EUCALIPTOS E POLO

Efetivo Médio	QT
Arquitetura total	04
-	00

Incidentes	QT
CAF/SAF	00
Acumulado	00

Cronograma	Data Prevista
Início	26/07/2022
Término	26/09/2022

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL

SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RESPONSABILIDADES DE OBRA

EUCALIPTOS+POLO

RELATÓRIO

Nº 09

Rev. 00

SBCD CAMINHOS DE DAMASCO		CONTROLE DE GERENCIAMENTO DE OBRA		
Nome:	Função:	Empresa:	Contatos	
Rafael Takeo	Engenheiro Civil (Gestor de obras e Projetos)	SBCD - Caminhos de Damasco	(11) 00000-0000	zn.engenharia@sbcd.org.br
Lucas Salzano Carloto Marcondes	Projetista (Fiscalização de obras)	SBCD - Caminhos de Damasco	(11) 00000-0001	zn.projetos@sbcd.org.br

ARQUITETURA TOTAL		EMPREITEIRO DE EXECUÇÃO DE OBRA		
Nome:	Função:	Empresa:	Contatos	
Paola Brito	Arquiteta(Gestora de obras e projetos)	ARQUITETURA TOTAL	(11) 930777653	arquiteta@arquiteturatotal.com.br
Matheus Maiolli	Auxiliar de engenharia(Fiscalização e acompanhamento de obra)	ARQUITETURA TOTAL	(11)940493051	operacional@arquiteturatotal.com.br
Daniela Gomes	Arquiteta(Projetos)	ARQUITETURA TOTAL	(11)957781068	reforma@arquiteturatotal.com.br

ARQUITETURA TOTAL		TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO		
Nome:	Função:	Empresa:	Contatos	
Luciano Bazani	Técnico de segurança(Fiscalização de segurança das obras)	ARQUITETURA TOTAL	(11) 981739082	tecnicodeseguranca@arquiteturatotal.com.br

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RESUMO DE SERVIÇOS DE OBRA

EUCALIPTOS+POLO

RELATÓRIO

Nº 09

Rev. 00

Reparos do telhado/forro/elétrica e pintura

Local:	Serviço:	Empresa:	Status
Área externa	Troca pontual do madeiramento	Arquitetura total	Finalizado
Área externa	Troca pontual do tipo telhas romanas	Arquitetura total	Finalizado
Área interna	Reparos pontuais no forro de PVC	Arquitetura total	Finalizado
Área externa/interna	Reparos hidráulicos	Arquitetura total	Finalizado
Área interna	Troca de interruptores e tomadas	Arquitetura total	Finalizado
Área externa/interna	Reparos do quadro de luz e disjuntores	Arquitetura total	Finalizado
Área externa	Preparativos(como lixamento) e pintura geral externa	Arquitetura total	Finalizado
Área interna	Preparativos(como lixamento) e pintura geral interna	Arquitetura total	Finalizado
Área interna	Pintura pontual dos tetos, que estejam danificados	Arquitetura total	Finalizado
Área externa	Pintura pontual dos gradis externos, que estejam danificados	Arquitetura total	Finalizado

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL

SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

CRONOGRAMA DE OBRA

EUCALIPTOS+POLO

RELATÓRIO

Nº 09

Rev. 00

UNIDADE DE SAÚDE - EUCALIPTOS I-II E POLO



Início do projeto:

ter, 26/07/2022

Semana de exibição:

1

TAREFA	ATRIBUÍDO PARA	PROGRESSO	INÍCIO	TÉRMINO
REPAROS TELHADO				
Vistoria do madeiramento	CIVIL	100%	26/7/22	27/7/22
Troca pontual do madeiramento	CIVIL	100%	28/7/22	1/8/22
Vistoria das telhas tipo romana	CIVIL	100%	27/7/22	29/7/22
Troca pontual das telhas tipo romana	CIVIL	100%	1/8/22	4/8/22
REPAROS GERAIS				
Vistoria nas áreas que precisam de reparos hidráulicos	HIDRÁULICA	100%	5/8/22	9/8/22
Pequenos reparos hidráulicos	HIDRÁULICA	100%	6/8/22	10/8/22

TAREFA	ATRIBUÍDO PARA	PROGRESSO	INÍCIO	TÉRMINO
ELÉTRICA				
Reparos em interruptores e tomadas	ELÉTRICA	100%	10/8/22	15/8/22
Reparos no Q.L e disjuntores	ELÉTRICA	100%	12/8/22	17/8/22
CLCB	ELÉTRICA	100%	5/8/22	10/9/22
SPDA	ELÉTRICA	100%	11/8/22	18/8/22
PINTURA				
Pintura geral externa	PINTURA	100%	8/8/22	22/8/22
Pintura geral interna	PINTURA	100%	22/8/22	5/9/22
Pintura pontual dos tetos, que estejam danificados	PINTURA	100%	5/9/22	12/9/22
Pintura pontual dos gradis externos, que estejam danifi	PINTURA	100%	12/9/22	20/9/22
Limpeza geral da obra	LIMPEZA	100%	21/9/22	23/9/22
ENTREGA FINAL				
	ARQ,TOTAL	100%	26/9/22	26/9/22

EMPREENHEIRO: ARQUITETURA TOTAL

SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

EUCALIPTOS + POLO

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO


Nº 09

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área externa	Vistoria inicial da unidade Eucaliptos	ARQUITETURA TOTAL	De 19/05/2022	Ate 19/05/2022



Vistoria inicial da unidade.

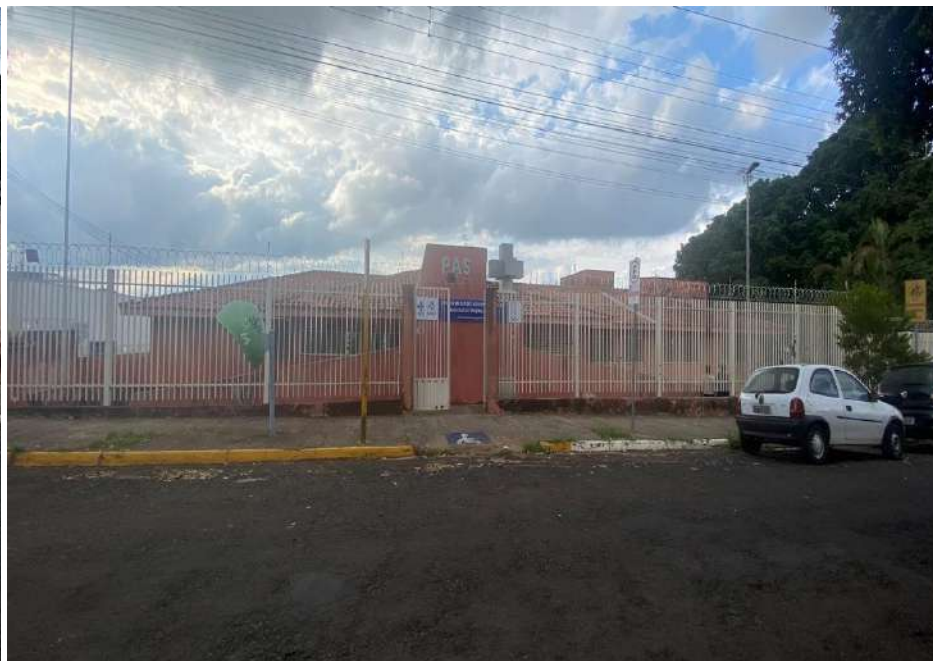

Vistoria inicial da unidade.

EMPREENHEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

EUCALIPTOS + POLO

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 09

Rev. 00


Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área interna	Vistoria inicial da unidade Eucaliptos	ARQUITETURA TOTAL	De 19/05/2022	Ate 19/05/2022



Vistoria inicial da unidade.



Vistoria inicial da unidade.

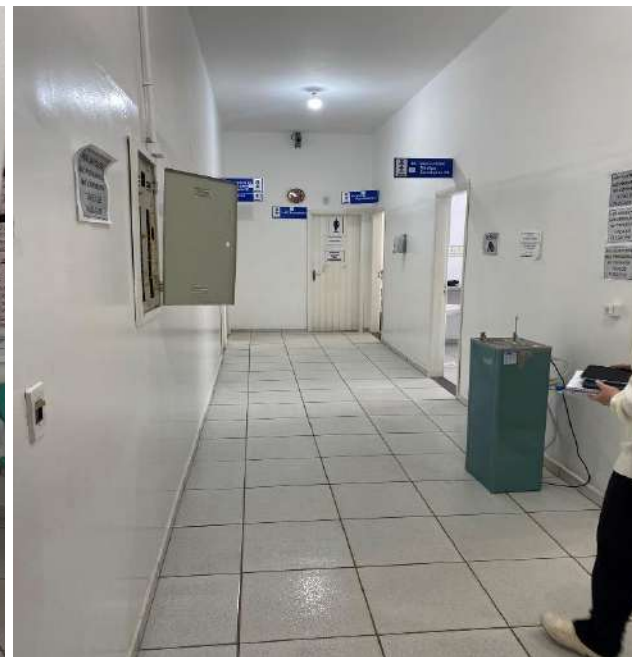

Vistoria inicial da unidade.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

EUCALIPTOS + POLO

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 09

Rev. 00


Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área interna	Vistoria inicial da unidade Eucaliptos	ARQUITETURA TOTAL	De 19/05/2022	Ate 19/05/2022



Vistoria inicial da unidade.



Vistoria inicial da unidade.

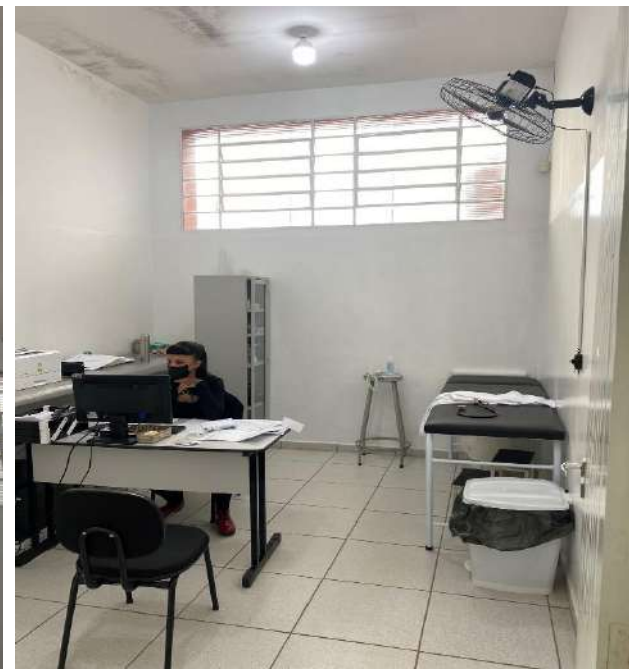

Vistoria inicial da unidade.

EMPREENHEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

EUCALIPTOS + POLO


RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO


Nº 09

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área interna	Vistoria inicial da unidade Eucaliptos	ARQUITETURA TOTAL	De 19/05/2022	Ate 19/05/2022

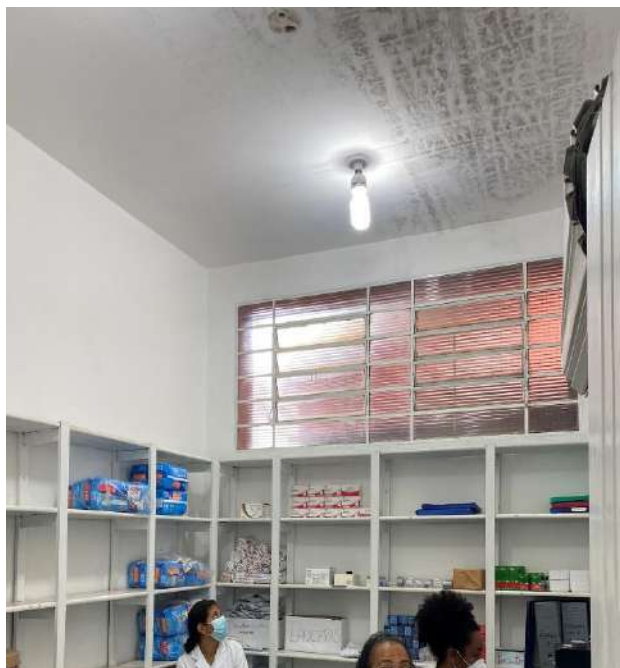

Vistoria inicial da unidade.

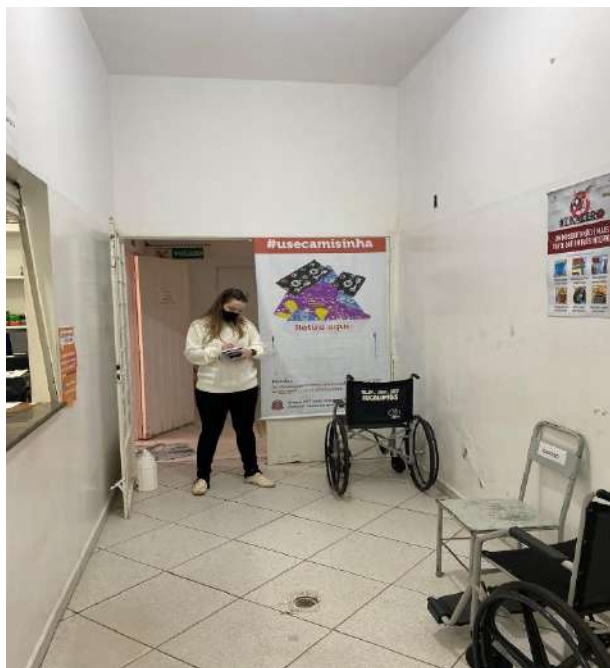

Vistoria inicial da unidade.



Vistoria inicial da unidade.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

EUCALIPTOS + POLO

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 09

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área interna	Vistoria inicial da unidade Eucaliptos	ARQUITETURA TOTAL	De 19/05/2022	Ate 19/05/2022



Vistoria inicial da unidade.



Vistoria inicial da unidade.



Vistoria inicial da unidade.

EMPREENHEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

EUCALIPTOS + POLO

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 09

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área externa	Vistoria inicial da unidade Polo	ARQUITETURA TOTAL	De 19/05/2022	Ate 19/05/2022



Vistoria inicial da unidade.



Vistoria inicial da unidade.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

EUCALIPTOS + POLO

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 09

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área externa	Vistoria inicial da unidade polo	ARQUITETURA TOTAL	De 19/05/2022	Ate 19/05/2022



Vistoria inicial da unidade.



Vistoria inicial da unidade.



Vistoria inicial da unidade.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

EUCALIPTOS + POLO

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 09

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área externa	Limpeza com hidrojateamento das fachadas e muros, além da raspagem do lodo e sujeira das paredes externas.	ARQUITETURA TOTAL	De 26/07/2022	Ate 29/07/2022



Limpeza com hidrojateamento das fachadas e muros, além da raspagem do lodo e sujeira das paredes externas.



Limpeza com hidrojateamento das fachadas e muros, além da raspagem do lodo e sujeira das paredes externas.



Limpeza com hidrojateamento das fachadas e muros, além da raspagem do lodo e sujeira das paredes externas.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

EUCALIPTOS + POLO

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 09

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área externa	Limpeza com hidrojateamento das fachadas e muros, além da raspagem do lodo e sujeira das paredes externas.	ARQUITETURA TOTAL	De 26/07/2022	Ate 29/07/2022



Limpeza com hidrojateamento das fachadas e muros, além da raspagem do lodo e sujeira das paredes externas.



Limpeza com hidrojateamento das fachadas e muros, além da raspagem do lodo e sujeira das paredes externas.



Limpeza com hidrojateamento das fachadas e muros, além da raspagem do lodo e sujeira das paredes externas.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

EUCALIPTOS + POLO

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 09

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área externa	Fechamento das trincas na base do muro, que circunda a unidade.	ARQUITETURA TOTAL	De 26/07/2022	Ate 29/07/2022



Fechamento das trincas na base do muro, que circunda a unidade.



Fechamento das trincas na base do muro, que circunda a unidade.



Fechamento das trincas na base do muro, que circunda a unidade.

EMPREENHEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

EUCALIPTOS + POLO

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 09

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área externa	Investigação, troca e reparos em madeiramentos, telhas e trincas.	ARQUITETURA TOTAL	De 26/07/2022	Ate 29/07/2022



Investigação, troca e reparos em madeiramentos, telhas e trincas.



Investigação, troca e reparos em madeiramentos, telhas e trincas.



Investigação, troca e reparos em madeiramentos, telhas e trincas.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

EUCALIPTOS + POLO

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 09

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área externa	Reparos das trincas área externa	ARQUITETURA TOTAL	De 29/07/2022	Ate 05/08/2022



Reparo das trincas nas muretas e muros externos.



Reparo das trincas nas muretas e muros externos.



Reparo das trincas nas muretas e muros externos.

EMPREENHEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

EUCALIPTOS + POLO

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 09

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área externa	Emassamento das paredes externas, preparação para a pintura e reparo das trincas do piso externo.	ARQUITETURA TOTAL	De 29/07/2022	Ate 05/08/2022



Emassamento das paredes externas, preparação para a pintura.



Emassamento das paredes externas, preparação para a pintura.



Reparo de trincas no piso externo, preenchimento com cimento.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

EUCALIPTOS + POLO

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO


Nº 09

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área externa	Emassamento das paredes externas, preparação para a pintura e reparo das trincas do piso externo.	ARQUITETURA TOTAL	De 29/07/2022	Ate 05/08/2022



Emassamento das paredes externas, preparação para a pintura.

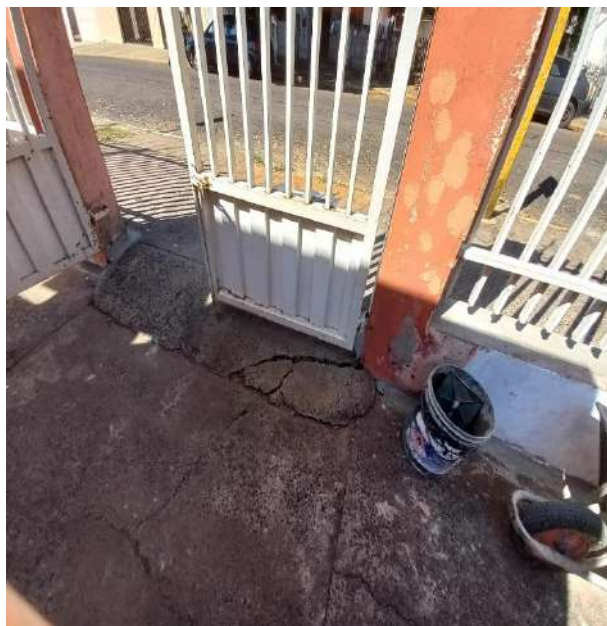

Reparo de trincas no piso externo, preenchimento com cimento.



Reparo de trincas no piso externo, preenchimento com cimento.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

EUCALIPTOS + POLO

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 09

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área externa	Emassamento das paredes externas e aplicação da primeira demanda de tinta da área externa.	ARQUITETURA TOTAL	De 29/07/2022	Ate 05/08/2022



Emassamento das paredes externas, preparação para a pintura.



Foi realizada a primeira demanda de tinta em parte da área externa.



Foi realizada a primeira demanda de tinta em parte da área externa.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

EUCALIPTOS + POLO

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 09

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área externa	Emassamento das paredes externas e aplicação da primeira demanda de tinta da área externa.	ARQUITETURA TOTAL	De 29/07/2022	Ate 05/08/2022



Foi realizada a primeira demanda de tinta em parte da área externa.



Foi realizada a primeira demanda de tinta em parte da área externa.



Foi realizada a primeira demanda de tinta em parte da área externa.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

EUCALIPTOS + POLO

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 09

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área externa	1ª demanda de pintura da fachada e dos muros.	ARQUITETURA TOTAL	De 05/08/2022	Ate 12/08/2022



1ª demanda de pintura da fachada e dos muros.



1ª demanda de pintura da fachada e dos muros.



1ª demanda de pintura da fachada e dos muros.

EMPREENHEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

EUCALIPTOS + POLO

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 09

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área interna	Emassamento das paredes internas, preparação para a pintura inclusive dos tetos.	ARQUITETURA TOTAL	De 05/08/2022	Ate 12/08/2022



Localização de áreas danificadas.



Emassamento das paredes internas, preparação para a pintura.



Emassamento e pintura das paredes e dos tetos.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

EUCALIPTOS + POLO

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 09

Rev. 00


Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área interna	Emassamento e pintura dos tetos.	ARQUITETURA TOTAL	De 05/08/2022	Ate 12/08/2022



Localização das áreas danificadas.



Pintura dos tetos internos das salas.

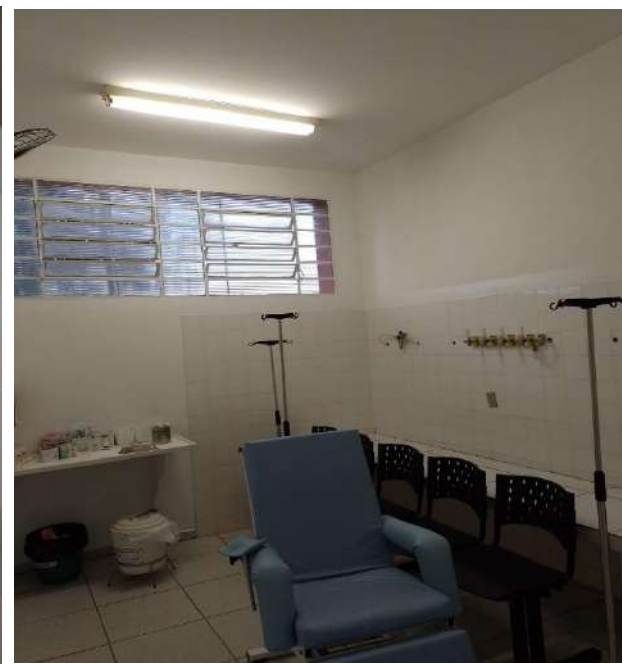

Pintura dos tetos internos das salas.

EMPREENHEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

EUCALIPTOS + POLO

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 09

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área interna	Reparos hidráulicos .	ARQUITETURA TOTAL	De 05/08/2022	Ate 12/08/2022



Reparo em ligação de esgoto e água dos sanitários internos.



Reparo em ligação de esgoto e água dos sanitários internos.



Reparo em ligação de esgoto e água dos sanitários internos.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

EUCALIPTOS + POLO

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 09

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área externa	Finalização da pintura externa unidade Eucaliptos e finalização do reparo no telhado.	ARQUITETURA TOTAL	De 12/08/2022	Ate 19/08/2022



Finalização da pintura externa unidade Eucaliptos e finalização do reparo no telhado.



Finalização da pintura externa unidade Eucaliptos e finalização do reparo no telhado.



Finalização da pintura externa unidade Eucaliptos e finalização do reparo no telhado.

EMPREENHEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

EUCALIPTOS + POLO

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 09

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área interna	Pintura da área externa e reparo de trincas unidade polo.	ARQUITETURA TOTAL	De 12/08/2022	Ate 19/08/2022



Finalização da pintura externa eucaliptos.



Finalização da pintura externa eucaliptos.



Reparo de trincas unidade polo.

EMPREENHEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

EUCALIPTOS + POLO

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 09

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área interna	Reparo em trincas, cobertura da imperfeições e preparação para a pintura.	ARQUITETURA TOTAL	De 12/08/2022	Ate 19/08/2022



Reparo em trincas, cobertura da imperfeições e preparação para a pintura.



Reparo em trincas, cobertura da imperfeições e preparação para a pintura.



Reparo em trincas, cobertura da imperfeições e preparação para a pintura.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

EUCALIPTOS + POLO

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 09

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área interna	Reparo em trincas, cobertura da imperfeições e preparação para a pintura.	ARQUITETURA TOTAL	De 12/08/2022	Ate 19/08/2022



Reparo em trincas, cobertura da imperfeições e preparação para a pintura.



Reparo em trincas, cobertura da imperfeições e preparação para a pintura.



Reparo em trincas, cobertura da imperfeições e preparação para a pintura.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

EUCALIPTOS + POLO

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 09

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área interna	Reparo em trincas, cobertura da imperfeições e preparação para a pintura.	ARQUITETURA TOTAL	De 12/08/2022	Ate 19/08/2022



Reparo em trincas, cobertura da imperfeições e preparação para a pintura.



Reparo em trincas, cobertura da imperfeições e preparação para a pintura.



Reparo em trincas, cobertura da imperfeições e preparação para a pintura.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

EUCALIPTOS + POLO

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 09

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área interna	Reparo em trincas, cobertura da imperfeições e preparação para a pintura.	ARQUITETURA TOTAL	De 12/08/2022	Ate 19/08/2022



Reparo em trincas, cobertura da imperfeições e preparação para a pintura.



Reparo em trincas, cobertura da imperfeições e preparação para a pintura.



Reparo em trincas, cobertura da imperfeições e preparação para a pintura.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

EUCALIPTOS + POLO

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 09

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área interna	Reparo em trincas, cobertura da imperfeições e preparação para a pintura.	ARQUITETURA TOTAL	De 12/08/2022	Ate 19/08/2022



Reparo em trincas, cobertura da imperfeições e preparação para a pintura.



Reparo em trincas, cobertura da imperfeições e preparação para a pintura.



Reparo em trincas, cobertura da imperfeições e preparação para a pintura.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

EUCALIPTOS + POLO

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 09

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área interna	Reparo da parte hidráulica e rejuntamento das pias.	ARQUITETURA TOTAL	De 12/08/2022	Ate 19/08/2022



Reparo da parte hidráulica e rejuntamento das pias.



Reparo da parte hidráulica e rejuntamento das pias.



Reparo da parte hidráulica e rejuntamento das pias.

EMPREENHEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

EUCALIPTOS + POLO

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 09

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área interna	Reparo da parte hidráulica e rejuntamento das pias.	ARQUITETURA TOTAL	De 12/08/2022	Ate 19/08/2022



Reparo da parte hidráulica e rejuntamento das pias.



Reparo da parte hidráulica e rejuntamento das pias.



Reparo da parte hidráulica e rejuntamento das pias.

EMPREENHEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

EUCALIPTOS + POLO

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 09

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área interna	Reparo da parte hidráulica e rejuntamento das pias.	ARQUITETURA TOTAL	De 12/08/2022	Ate 19/08/2022



Reparo da parte hidráulica e rejuntamento das pias.



Reparo da parte hidráulica e rejuntamento das pias.



Reparo da parte hidráulica e rejuntamento das pias.

EMPREENHEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

EUCALIPTOS + POLO


RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 09

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área interna	Finalização dos tetos unidade Eucaliptos e reparos de trincas unidade polo.	ARQUITETURA TOTAL	De 12/08/2022	Ate 19/08/2022

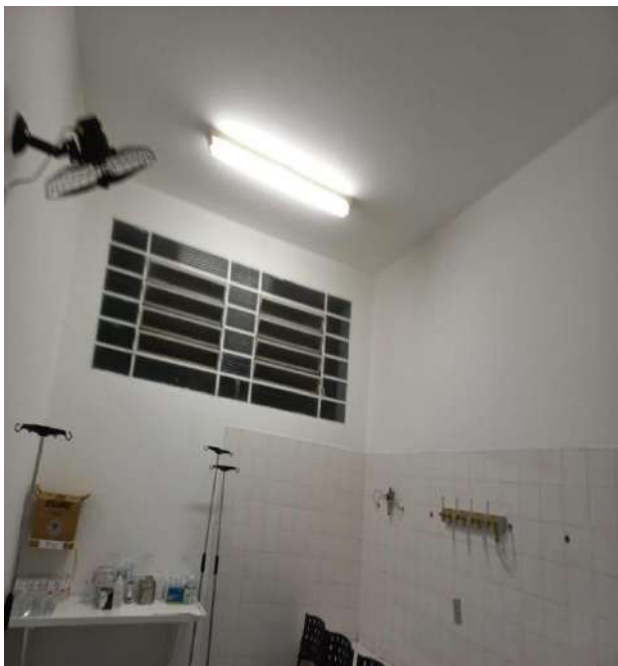

Finalização dos tetos unidade Eucaliptos.



Finalização dos tetos unidade Eucaliptos.



Reparos de trincas unidade polo.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

EUCALIPTOS + POLO

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 09

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área interna	Reparo em trincas, cobertura da imperfeições e preparação para a pintura.	ARQUITETURA TOTAL	De 12/08/2022	Ate 19/08/2022



Reparo em trincas, cobertura da imperfeições e preparação para a pintura.



Reparo em trincas, cobertura da imperfeições e preparação para a pintura.



Reparo em trincas, cobertura da imperfeições e preparação para a pintura.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

EUCALIPTOS + POLO

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 09

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área interna	Finalização da pintura interna, unidade Eucaliptos.	ARQUITETURA TOTAL	De 12/08/2022	Ate 19/08/2022



Finalização da pintura interna, unidade Eucaliptos.



Finalização da pintura interna, unidade Eucaliptos.



Finalização da pintura interna, unidade Eucaliptos.

EMPREENHEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

EUCALIPTOS + POLO

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 09

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área interna	Finalização da pintura da área interna.	ARQUITETURA TOTAL	De 19/08/2022	Ate 26/08/2022



Finalização da pintura da área interna.



Finalização da pintura da área interna.



Finalização da pintura da área interna.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

EUCALIPTOS + POLO

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 09

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área interna	Finalização da pintura da área interna, e preparação para pintura unidade polo.	ARQUITETURA TOTAL	De 19/08/2022	Ate 26/08/2022



Finalização da pintura da área interna.



Finalização da pintura da área interna.



Preparação para pintura unidade polo.

EMPREENHEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

EUCALIPTOS + POLO

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 09

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área interna	Finalização da pintura interna, unidade Polo.	ARQUITETURA TOTAL	De 19/08/2022	Ate 26/08/2022



Preparação para pintura unidade polo.



Finalização da pintura da área interna da unidade Polo.



Finalização da pintura da área interna da unidade Polo.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

EUCALIPTOS + POLO

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 09

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área externa	Finalização da pintura da área externa.	ARQUITETURA TOTAL	De 26/08/2022	Ate 02/09/2022



Finalização da pintura da área externa.



Finalização da pintura da área externa.



Finalização da pintura da área externa.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

EUCALIPTOS + POLO

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 09

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área externa	Finalização da pintura da área externa e dos gradis.	ARQUITETURA TOTAL	De 26/08/2022	Ate 02/09/2022



Finalização da pintura da área externa e dos gradis.



Finalização da pintura da área externa.



Finalização da pintura da área externa.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

EUCALIPTOS + POLO

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 09

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área externa	Finalização da pintura da área externa e dos gradis.	ARQUITETURA TOTAL	De 26/08/2022	Ate 02/09/2022



Finalização da pintura da área externa e dos gradis.



Finalização da pintura da área externa.



Finalização da pintura da área externa.

EMPREENHEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

EUCALIPTOS + POLO

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 09

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área externa	Finalização da pintura e dos reparos do telhado.	ARQUITETURA TOTAL	De 26/08/2022	Ate 02/09/2022



Finalização da pintura e dos reparos do telhado.



Finalização da pintura e dos reparos do telhado.



Finalização da pintura e dos reparos do telhado.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

EUCALIPTOS + POLO

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 09

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área externa	Finalização da pintura e dos reparos do telhado.	ARQUITETURA TOTAL	De 26/08/2022	Ate 02/09/2022



Finalização da pintura e dos reparos do telhado.



Finalização da pintura e dos reparos do telhado.



Finalização da pintura e dos reparos do telhado.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

EUCALIPTOS + POLO

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 09

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área externa	Começo da instalação do SPDA, enterramento dos cabos.	ARQUITETURA TOTAL	De 26/08/2022	Ate 02/09/2022



Começo da instalação do SPDA,
enterramento dos cabos.



Começo da instalação do SPDA,
enterramento dos cabos.



Começo da instalação do SPDA,
enterramento dos cabos.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

EUCALIPTOS + POLO

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO


Nº 09

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área interna	Finalização da pintura interna das unidades e finalização da colocação dos interruptores.	ARQUITETURA TOTAL	De 26/08/2022	Ate 02/09/2022



Finalização da pintura interna das unidades e finalização da colocação dos interruptores.

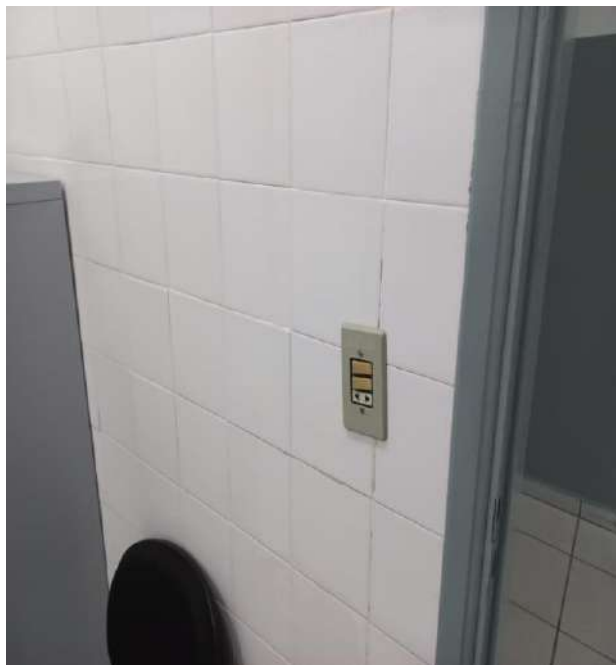

Finalização da pintura interna das unidades e finalização da colocação dos interruptores.



Finalização da pintura interna das unidades e finalização da colocação dos interruptores.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

EUCALIPTOS + POLO

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 09

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área externa	Finalização da pintura da área externa - Polo.	ARQUITETURA TOTAL	De 02/09/2022	Ate 09/09/2022



Finalização da pintura da área externa.



Finalização da pintura da área externa.



Finalização da pintura da área externa.

EMPREENHEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

EUCALIPTOS + POLO

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 09

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área interna	Finalização da pintura da área interna – polo/eucaliptos.	ARQUITETURA TOTAL	De 02/09/2022	Ate 09/09/2022



Finalização da pintura da área interna.



Finalização da pintura da área interna.



Finalização da pintura da área interna.

EMPREENHEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

EUCALIPTOS + POLO

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 09

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área externa	Finalização da pintura da área externa – Polo e Eucaliptos.	ARQUITETURA TOTAL	De 09/09/2022	Ate 16/09/2022



Finalização da pintura da área externa.



Finalização da pintura da área externa.



Finalização da pintura da área externa.

EMPREENHEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

EUCALIPTOS + POLO

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 09

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área externa	Finalização da pintura da área externa – Polo e Eucaliptos.	ARQUITETURA TOTAL	De 09/09/2022	Ate 16/09/2022



Finalização da pintura da área externa.



Finalização da pintura da área externa.



Finalização da pintura da área externa.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

EUCALIPTOS + POLO

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 09

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área externa	Finalização da pintura da área externa – Polo e Eucaliptos.	ARQUITETURA TOTAL	De 09/09/2022	Ate 16/09/2022



Finalização da pintura da área externa.



Finalização da pintura da área externa.



Finalização da pintura da área externa.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

EUCALIPTOS + POLO

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 09

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área externa	Finalização da pintura da área externa – Polo e Eucaliptos.	ARQUITETURA TOTAL	De 09/09/2022	Ate 16/09/2022



Finalização da pintura da área externa.



Finalização da pintura da área externa.



Finalização da pintura da área externa.

EMPREENHEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

EUCALIPTOS + POLO

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 09

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área externa	Finalização da pintura da área externa – Polo e Eucaliptos.	ARQUITETURA TOTAL	De 09/09/2022	Ate 16/09/2022



Finalização da pintura da área externa.



Finalização da pintura da área externa.



Finalização da pintura da área externa.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

EUCALIPTOS + POLO

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 09

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área externa	Finalização da pintura da área externa – Polo e Eucaliptos.	ARQUITETURA TOTAL	De 09/09/2022	Ate 16/09/2022



Finalização da pintura da área externa.



Finalização da pintura da área externa.



Finalização da pintura da área externa.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

EUCALIPTOS + POLO

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 09

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área externa	Finalização da pintura da área externa – Polo e Eucaliptos.	ARQUITETURA TOTAL	De 09/09/2022	Ate 16/09/2022



Finalização da pintura da área externa.



Finalização da pintura da área externa.



Finalização da pintura da área externa.

EMPREENHEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

EUCALIPTOS + POLO

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 09

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área externa	Finalização da pintura da área externa – Polo e Eucaliptos.	ARQUITETURA TOTAL	De 09/09/2022	Ate 16/09/2022



Finalização da pintura da área externa.



Finalização da pintura da área externa.



Finalização da pintura da área externa.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

EUCALIPTOS + POLO

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 09

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área interna	Finalização da pintura da área interna – polo/eucaliptos.	ARQUITETURA TOTAL	De 09/09/2022	Ate 16/09/2022



Finalização da pintura da área interna.



Finalização da pintura da área interna.



Finalização da pintura da área interna.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

EUCALIPTOS + POLO

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 09

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área interna	Finalização da pintura da área interna – polo/eucaliptos.	ARQUITETURA TOTAL	De 09/09/2022	Ate 16/09/2022



Finalização da pintura da área interna.



Finalização da pintura da área interna.



Finalização da pintura da área interna.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRAFICO DE OBRA

EUCALIPTOS + POLO

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 09

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área interna	Finalização da pintura da área interna – polo/eucaliptos.	ARQUITETURA TOTAL	De 09/09/2022	Ate 16/09/2022



Finalização da pintura da área interna.



Finalização da pintura da área interna.



Finalização da pintura da área interna.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

EUCALIPTOS + POLO

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 09

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área interna	Finalização da pintura da área interna – polo/eucaliptos.	ARQUITETURA TOTAL	De 09/09/2022	Ate 16/09/2022



Finalização da pintura da área interna.



Finalização da pintura da área interna.



Finalização da pintura da área interna.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRAFICO DE OBRA

EUCALIPTOS + POLO

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 09

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área interna	Finalização da pintura da área interna – polo/eucaliptos.	ARQUITETURA TOTAL	De 09/09/2022	Ate 16/09/2022



Finalização da pintura da área interna.



Finalização da pintura da área interna.



Finalização da pintura da área interna.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRAFICO DE OBRA

EUCALIPTOS + POLO

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 09

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área interna	Finalização da pintura da área interna – polo/eucaliptos.	ARQUITETURA TOTAL	De 09/09/2022	Ate 16/09/2022



Finalização da pintura da área interna.



Finalização da pintura da área interna.



Finalização da pintura da área interna.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

EUCALIPTOS + POLO

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 09

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área Externa	Finalização da obra	ARQUITETURA TOTAL	De 16/09/2022	Ate 23/09/2022



Finalização da obra.



Finalização da obra.



Finalização da obra.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

EUCALIPTOS + POLO

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 09

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área Externa	Finalização da obra	ARQUITETURA TOTAL	De 16/09/2022	Ate 23/09/2022



Finalização da obra.



Finalização da obra.



Finalização obra.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

EUCALIPTOS + POLO

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 09

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área Externa	Finalização da obra.	ARQUITETURA TOTAL	De 16/09/2022	Ate 23/09/2022



Finalização da obra.



Finalização da obra.



Finalização da obra.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



JAF A



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO DE ENTREGA FINAL

RELATÓRIO

Nº 04

Rev. 00

CONTROLE DE GERENCIAMENTO DE OBRA

UNIDADE: Jafa

Efetivo Médio	QT
Arquitetura total	04
-	00

Incidentes	QT
CAF/SAF	00
Acumulado	00

Cronograma	Data Prevista
Início	26/09/2022
Término	31/10/2022

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL

SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RESPONSABILIDADES DE OBRA

Jafa

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 04

Rev. 00

SBCD CAMINHOS DE DAMASCO		CONTROLE DE GERENCIAMENTO DE OBRA		
Nome:	Função:	Empresa:	Contatos	
Rafael Takeo	Engenheiro Civil (Gestor de obras e Projetos)	SBCD - Caminhos de Damasco	(11) 00000-0000	zn.engenharia@sbcd.org.br
Lucas Salzano Carloto Marcondes	Projetista (Fiscalização de obras)	SBCD - Caminhos de Damasco	(11) 00000-0001	zn.projetos@sbcd.org.br

ARQUITETURA TOTAL		EMPREITEIRO DE EXECUÇÃO DE OBRA		
Nome:	Função:	Empresa:	Contatos	
Paola Brito	Arquiteta(Gestora de obras e projetos)	ARQUITETURA TOTAL	(11) 930777653	arquiteta@arquiteturatotal.com.br
Matheus Maiolli	Auxiliar de engenharia(Fiscalização e acompanhamento de obra)	ARQUITETURA TOTAL	(11)940493051	operacional@arquiteturatotal.com.br
Daniela Gomes	Arquiteta(Projetos)	ARQUITETURA TOTAL	(11)957781068	reforma@arquiteturatotal.com.br

ARQUITETURA TOTAL		TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO		
Nome:	Função:	Empresa:	Contatos	
Luciano Bazani	Técnico de segurança(Fiscalização de segurança das obras)	ARQUITETURA TOTAL	(11) 981739082	tecnicodeseguranca@arquiteturatotal.com.br

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL

SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RESUMO DE SERVIÇOS DE OBRA

Jafa

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 04

Rev. 00

Reparos do telhado/forro/elétrica e pintura

Local:	Serviço:	Empresa:	Status
Área externa	Troca pontual do madeiramento	Arquitetura total	Finalizado
Área externa	Troca pontual do tipo telhas de fibrocimento	Arquitetura total	Finalizado
Área interna	Reparos pontuais no forro de PVC	Arquitetura total	Finalizado
Área externa/interna	Reparos hidráulicos	Arquitetura total	Finalizado
Área interna	Troca de interruptores e tomadas	Arquitetura total	Finalizado
Área externa/interna	Reparos do quadro de luz e disjuntores	Arquitetura total	Finalizado
Área externa	Preparativos(como lixamento) e pintura geral externa	Arquitetura total	Finalizado
Área interna	Preparativos(como lixamento) e pintura geral interna	Arquitetura total	Finalizado
Área interna	Pintura pontual dos tetos, que estejam danificados	Arquitetura total	Finalizado
Área externa	Pintura pontual dos gradis externos, que estejam danificados	Arquitetura total	Finalizado

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL

SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

CRONOGRAMA DE OBRA

JAFÁ

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 04

Rev. 00

UNIDADE DE SAÚDE - JAFÁ



Início do projeto:

ter, 27/09/2022

Semana de exibição:

1

TAREFA	ATRIBUÍDO PARA	PROGRESSO	INÍCIO	TÉRMINO
REPAROS TELHADO				
Vistoria do madeiramento	CIVIL	100%	27/9/22	30/9/22
Troca pontual do madeiramento	CIVIL	100%	3/10/22	7/10/22
Vistoria das telhas tipo de Fibrocimento	CIVIL	100%	4/10/22	6/10/22
Troca pontual das telhas tipo Fibrocimento	CIVIL	100%	10/10/22	13/10/22
REPAROS GERAIS				
Vistoria nas área de forro	CIVIL	100%	28/10/22	30/10/22
Reparos pontuais no forro de PVC existente	CIVIL	100%	5/10/22	11/10/22
substituição pontual do forro de PVC	CIVIL	100%	11/10/22	17/10/22
Pequenos reparos hidráulicos	HIDRÁULICA	100%	18/10/22	20/10/22

TAREFA	ATRIBUÍDO PARA	PROGRESSO	INÍCIO	TÉRMINO
ELÉTRICA				
Reparos em interruptores e tomadas	ELÉTRICA	80%	27/6/22	28/6/22
Reparos no Q.L e disjuntores	ELÉTRICA	100%	29/6/22	30/6/22
CLCB	ELÉTRICA	100%	11/7/22	13/7/22
SPDA	ELÉTRICA	100%	9/7/22	12/7/22
PINTURA				
Pintura geral externa	PINTURA	100%	3/10/22	14/10/22
Pintura geral interna	PINTURA	100%	7/10/22	21/10/22
Pintura pontual dos tetos, que estejam danificados	PINTURA	100%	14/10/22	28/10/22
Pintura pontual dos gradis externos, que estejam danifi	PINTURA	100%	17/10/22	27/10/22
Limpeza geral da obra	LIMPEZA	100%	28/10/22	31/10/22
Insira novas linhas ACIMA desta				
ENTREGA FINAL	ARQ.TOTAL	100%	31/10/22	31/10/22

EMPREENHEIRO: ARQUITETURA TOTAL

SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

JAFÁ

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 04

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área externa	Vistoria inicial da unidade.	ARQUITETURA TOTAL	De 24/06/2022	Ate 24/06/2022



Vistoria inicial da unidade.



Vistoria inicial da unidade.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

JAFÁ


RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 04

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área interna	Vistoria inicial da unidade.	ARQUITETURA TOTAL	De 24/06/2022	Ate 24/06/2022

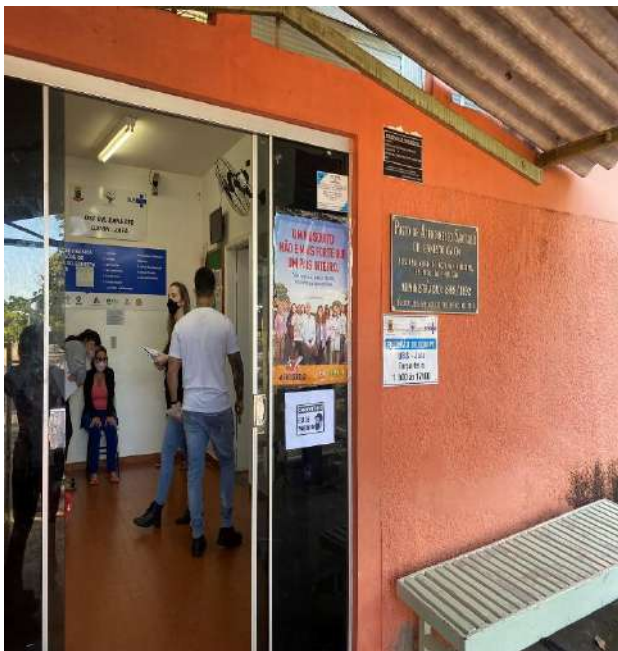

Vistoria inicial da unidade.



Vistoria inicial da unidade.



Vistoria inicial da unidade.

EMPREENHEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

Jafa

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 04

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área interna	Vistoria inicial da unidade.	ARQUITETURA TOTAL	De 24/06/2022	Ate 24/06/2022



Vistoria inicial da unidade.



Vistoria inicial da unidade.



Vistoria inicial da unidade.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

JAFÁ

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 04

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área interna	Vistoria inicial da unidade.	ARQUITETURA TOTAL	De 24/06/2022	Ate 24/06/2022



Vistoria inicial da unidade.



Vistoria inicial da unidade.



Vistoria inicial da unidade.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

Jafa

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 04

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área interna	Vistoria inicial da unidade.	ARQUITETURA TOTAL	De 24/06/2022	Ate 24/06/2022



Vistoria inicial da unidade.



Vistoria inicial da unidade.



Vistoria inicial da unidade.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRAFICO DE OBRA

Jafa

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 04

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área interna	Vistoria inicial da unidade.	ARQUITETURA TOTAL	De 24/06/2022	Ate 24/06/2022



Vistoria inicial da unidade.



Vistoria inicial da unidade.



Vistoria inicial da unidade.

EMPREENHEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

Jafa
RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 04

Rev. 00

Local:		Empresa:	Período	
Área externa	Tratamento das rachaduras, trincas e o reboco de paredes além do concerto do telhado.	ARQUITETURA TOTAL	De 30/09/2022	Ate 07/10/2022



Tratamento das rachaduras, trincas e o reboco de paredes além do concerto do telhado.



Tratamento das rachaduras, trincas e o reboco de paredes além do concerto do telhado.



Tratamento das rachaduras, trincas e o reboco de paredes além do concerto do telhado.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

JAFa
RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 04

Rev. 00

Local:		Empresa:	Período	
Área externa	Tratamento das rachaduras, trincas e o reboco de paredes além do concerto do telhado.	ARQUITETURA TOTAL	De 30/09/2022	Ate 07/10/2022



Tratamento das rachaduras, trincas e o reboco de paredes além do concerto do telhado.



Tratamento das rachaduras, trincas e o reboco de paredes além do concerto do telhado.



Tratamento das rachaduras, trincas e o reboco de paredes além do concerto do telhado.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

JAFa
RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 04

Rev. 00

Local:		Empresa:	Período	
Área externa	Tratamento das rachaduras, trincas e o reboco de paredes além do concerto do telhado.	ARQUITETURA TOTAL	De 30/09/2022	Ate 07/10/2022



Tratamento das rachaduras, trincas e o reboco de paredes além do concerto do telhado.



Tratamento das rachaduras, trincas e o reboco de paredes além do concerto do telhado.



Tratamento das rachaduras, trincas e o reboco de paredes além do concerto do telhado.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

JAFÁ
RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 04

Rev. 00

Local:		Empresa:	Período	
Área interna	Tratamento das rachaduras, trincas e preparo para a pintura.	ARQUITETURA TOTAL	De 30/09/2022	Ate 07/10/2022



Tratamento das rachaduras, trincas e preparo para a pintura.



Tratamento das rachaduras, trincas e preparo para a pintura.



Tratamento das rachaduras, trincas e preparo para a pintura.

EMPREENHEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

JAFa
RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 04

Rev. 00

Local:	Empresa:		Período	
Área interna	Tratamento das rachaduras, trincas e preparo para a pintura.	ARQUITETURA TOTAL	De 30/09/2022	Ate 07/10/2022



Tratamento das rachaduras, trincas e preparo para a pintura.



Tratamento das rachaduras, trincas e preparo para a pintura.



Tratamento das rachaduras, trincas e preparo para a pintura.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

JAFÁ
RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 04

Rev. 00

Local:		Empresa:	Período	
Área externa	Tratamento das rachaduras e trincas nas paredes da área externa.	ARQUITETURA TOTAL	De 07/10/2022	Ate 14/10/2022



Tratamento das rachaduras e trincas nas paredes da área externa.



Tratamento das rachaduras e trincas nas paredes da área externa.



Tratamento das rachaduras e trincas nas paredes da área externa.

EMPREENHEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

JAFÁ
RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 04

Rev. 00

Local:		Empresa:	Período	
Área externa	Troca das telhas e madeiramentos danificados.	ARQUITETURA TOTAL	De 07/10/2022	Ate 14/10/2022



Troca das telhas e madeiramentos danificados.



Troca das telhas e madeiramentos danificados.



Troca das telhas e madeiramentos danificados.

EMPREENHEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

Jafa
RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 04

Rev. 00

Local:		Empresa:	Período	
Área externa	Finalização das trocas de telhas e madeiramentos.	ARQUITETURA TOTAL	De 07/10/2022	Ate 14/10/2022



Finalização das trocas de telhas e madeiramentos.



Finalização das trocas de telhas e madeiramentos.



Finalização das trocas de telhas e madeiramentos.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA


Jafa
RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 04

Rev. 00

Local:		Empresa:	Período	
Área interna	Pintura de tetos e paredes, realizada nos consultórios.	ARQUITETURA TOTAL	De 07/10/2022	Ate 14/10/2022

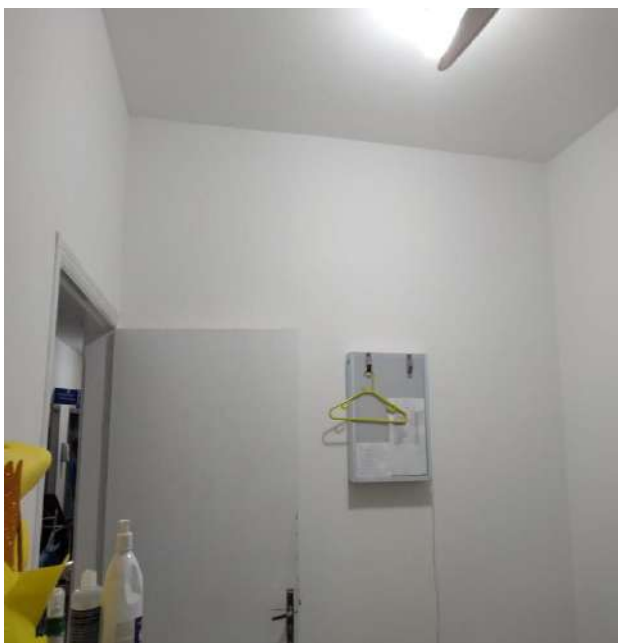

Pintura de tetos e paredes, realizada nos consultórios.



Pintura de tetos e paredes, realizada nos consultórios.



Pintura de tetos e paredes, realizada nos consultórios.

EMPREENHEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

JAFa
RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 04

Rev. 00

Local:		Empresa:	Período	
Área interna	Tratamento de rachaduras e trincas da parte interna dos consultórios.	ARQUITETURA TOTAL	De 07/10/2022	Ate 14/10/2022



Tratamento de rachaduras e trincas da parte interna dos consultórios.



Tratamento de rachaduras e trincas da parte interna dos consultórios.



Tratamento de rachaduras e trincas da parte interna dos consultórios.

EMPREENHEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

JAFÁ
RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 04

Rev. 00

Local:		Empresa:	Período	
Área interna	Finalização de pintura de tetos e paredes, realizada na parte interna da unidade.	ARQUITETURA TOTAL	De 14/10/2022	Ate 21/10/2022



Finalização de pintura de tetos e paredes, realizada na parte interna da unidade.



Finalização de pintura de tetos e paredes, realizada na parte interna da unidade.



Finalização de pintura de tetos e paredes, realizada na parte interna da unidade.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

Jafa

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 04

Rev. 00

Local:		Empresa:	Período	
Área interna	Finalização de pintura de tetos e paredes, realizada na parte interna da unidade.	ARQUITETURA TOTAL	De 14/10/2022	Ate 21/10/2022



Finalização de pintura de tetos e paredes, realizada na parte interna da unidade.



Finalização de pintura de tetos e paredes, realizada na parte interna da unidade.



Finalização de pintura de tetos e paredes, realizada na parte interna da unidade.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

Jafa


RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 04

Rev. 00

Local:		Empresa:	Período	
Área interna	Finalização de pintura de tetos e paredes, realizada na parte interna da unidade.	ARQUITETURA TOTAL	De 14/10/2022	Ate 21/10/2022

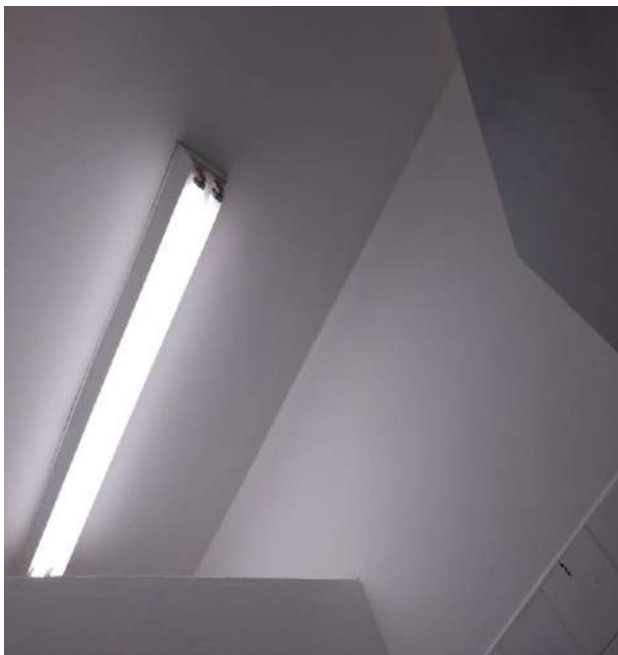

Finalização de pintura de tetos e paredes, realizada na parte interna da unidade.



Finalização de pintura de tetos e paredes, realizada na parte interna da unidade.



Finalização de pintura de tetos e paredes, realizada na parte interna da unidade.

EMPREENHEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

Jafa

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 04

Rev. 00


Local:		Empresa:	Período	
Área interna	Reparo no piso interno da unidade, e realização de pequenas infraestruturas elétricas.	ARQUITETURA TOTAL	De 14/10/2022	Ate 21/10/2022



Reparo no piso interno da unidade.



Reparo no piso interno da unidade.

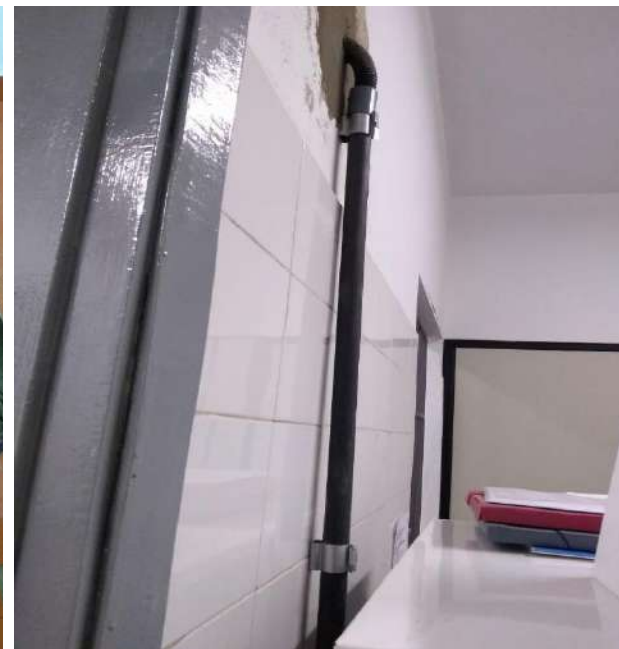

Realização de pequenas infraestruturas elétricas.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

Jafa

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 04

Rev. 00

Local:		Empresa:	Período	
Área Externa	Finalização da pintura e limpeza geral da unidade.	ARQUITETURA TOTAL	De 21/10/2022	Ate 28/10/2022



Finalização da pintura.



Finalização da pintura.



Finalização da pintura.

EMPREENHEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



LABIENÓPOLIS

CONTROLE DE GERENCIAMENTO DE OBRA

UNIDADE: LABIENÓPOLIS

Relatório Final

Efetivo Médio	QT
Arquitetura total	04
-	00

Incidentes	QT
CAF/SAF	00
Acumulado	00

Cronograma	Data Prevista
Início	27/02/2023
Término	27/03/2023

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL

SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD

RESPONSABILIDADES DE OBRA

LABIENÓPOLIS

RELATÓRIO

Nº 08

Rev. 00

SBCD CAMINHOS DE DAMASCO		CONTROLE DE GERENCIAMENTO DE OBRA		
Nome:	Função:	Empresa:	Contatos	
Rafael Takeo	Engenheiro Civil (Gestor de obras e Projetos)	SBCD - Caminhos de Damasco	(11) 00000-0000	zn.engenharia@sbcd.org.br
Lucas Salzano Carloto Marcondes	Projetista (Fiscalização de obras)	SBCD - Caminhos de Damasco	(11) 00000-0001	zn.projetos@sbcd.org.br
ARQUITETURA TOTAL		EMPREITEIRO DE EXECUÇÃO DE OBRA		
Nome:	Função:	Empresa:	Contatos	
Davi Cesar	Supervisor(Supervisão de obras)	ARQUITETURA TOTAL	(11) 920041659	supervisor@arquiteturatotal.com.br
Paola Brito	Arquiteta(Gestora)	ARQUITETURA TOTAL	(11) 930777653	arquiteta@arquiteturatotal.com.br
Matheus Maiolli	Auxiliar de engenharia(Fiscalização e acompanhamento de obra)	ARQUITETURA TOTAL	(11)940493051	operacional@arquiteturatotal.com.br
Daniela Gomes	Arquiteta(Projetos)	ARQUITETURA TOTAL	(11)957781068	reforma@arquiteturatotal.com.br
ARQUITETURA TOTAL		TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO		
Nome:	Função:	Empresa:	Contatos	
Luciano Bazani	Técnico de segurança(Fiscalização de segurança das obras)	ARQUITETURA TOTAL	(11) 981739082	tecnicodeseguranca@arquiteturatotal.com.br

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Brasileira
Caminho de Damasco - SBCD

RESUMO DE SERVIÇOS DE OBRA

LABIENÓPOLIS

RELATÓRIO

Nº 08

Rev. 00

Reparos do telhado/elétrica e pintura

Local:	Serviço:	Empresa:	Status
Área externa	Troca pontual dos apoios do telhado	Arquitetura total	Finalizado
Área externa	Troca pontual do tipo telhas romanas	Arquitetura total	Finalizado
Área interna	Reparos pontuais em ralos e etc.	Arquitetura total	Finalizado
Área externa/interna	Reparos hidráulicos	Arquitetura total	Finalizado
Área interna	Troca de interruptores e tomadas	Arquitetura total	Finalizado
Área externa/interna	Reparos do quadro de luz e disjuntores	Arquitetura total	Finalizado
Área externa	Preparativos(como lixamento) e pintura geral externa	Arquitetura total	Finalizado
Área interna	Preparativos(como lixamento) e pintura geral interna	Arquitetura total	Finalizado
Área interna	Pintura pontual dos tetos, que estejam danificados	Arquitetura total	Finalizado
Área externa	Pintura pontual dos gradis externos, que estejam danificados	Arquitetura total	Finalizado

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL

SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Brasileira
Caminho de Damasco - SBCD

CRONOGRAMA DE OBRA

LABIENÓPOLIS

RELATÓRIO

Nº 08

Rev. 00

UNIDADE DE SAÚDE - LABIENÓPOLIS



Início do projeto:

seg, 27/02/2023

Semana de exibição:

1

TAREFA	ATRIBUÍDO PARA	PROGRESSO	INÍCIO	TÉRMINO
REPAROS TELHADO				
Vistoria dos suportes do telhado	CIVIL	100%	27/2/23	1/3/23
Troca pontual dos suportes	CIVIL	100%	6/2/23	1/3/23
Vistoria das telhas tipo romana	CIVIL	100%	27/2/23	29/02/2023
Troca pontual das telhas tipo romana	CIVIL	100%	10/2/23	27/2/23
REPAROS GERAIS				
Pequenos reparos hidráulicos	HIDRÁULICA	100%	27/2/23	15/3/23
ELÉTRICA				
Reparos em interruptores e tomadas pontuais	ELÉTRICA	100%	21/2/23	25/2/23
Reparos no Q.L e disjuntores	ELÉTRICA	100%	21/2/23	25/2/23
CLCB	ELÉTRICA	100%	19/3/22	21/3/23
SPDA	ELÉTRICA	100%	19/12/22	25/1/23

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL

SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Brasileira
Caminho de Damasco - SBCD

CRONOGRAMA DE OBRA

LABIENÓPOLIS

RELATÓRIO

Nº 08

Rev. 00

TAREFA	ATRIBUÍDO PARA	PROGRESSO	INÍCIO	TÉRMINO
PINTURA				
Pintura geral externa	PINTURA	100%	20/2/23	20/3/23
Pintura geral interna	PINTURA	100%	20/2/23	22/3/23
Pintura pontual dos tetos, que estejam danificados	PINTURA	100%	19/2/23	20/3/23
Pintura pontual dos gradis externos, que estejam danifi	PINTURA	100%	1/3/23	20/3/23
Limpeza geral da obra	LIMPEZA	100%	28/2/23	22/3/23
Exemplo de título de fase de exemplo:				
Insira novas linhas ACIMA desta				
ENTREGA FINAL	ARQ.TOTAL	100%	27/3/23	27/3/23
*O presente cronograma leva em consideração o recesso de final de ano.				
*Os serviços de trocas em geral como tomadas, interruptores, telhas e etc são referentes a pontualidades encontradas nas unidades, não são trocas totais é apenas do que for estritamente necessário.				

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL

SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD

CRONOGRAMA DE OBRA

LABIENÓPOLIS

RELATÓRIO
Nº 08
Rev. 00

Observação

- **Relatório Final.**



Sociedade Brasileira
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

LABIENÓPOLIS

RELATÓRIO

Nº 08

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área externa	Finalização	ARQUITETURA TOTAL	De 24/03/2023	Ate 27/03/2023



Finalização



Finalização



Finalização

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Brasileira
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

LABIENÓPOLIS

RELATÓRIO

Nº 08

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área externa	Finalização	ARQUITETURA TOTAL	De 24/03/2023	Ate 27/03/2023



Finalização



Finalização



Finalização

EMPREENHEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Brasileira
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRAFICO DE OBRA

LABIENÓPOLIS

RELATÓRIO

Nº 08

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área externa/Interna	Finalização	ARQUITETURA TOTAL	De 24/03/2023	Ate 27/03/2023



Finalização



Finalização



Finalização

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Brasileira
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

LABIENÓPOLIS

RELATÓRIO

Nº 08

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área externa	Finalização	ARQUITETURA TOTAL	De 24/03/2023	Ate 27/03/2023



Finalização



Finalização



Finalização

EMPREENHEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



MARIANA II



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO

Nº 06

Rev. 00

CONTROLE DE GERENCIAMENTO DE OBRA

UNIDADE: MARIANA II

RELATÓRIO FINAL

Efetivo Médio	QT
Arquitetura total	04
-	00

Incidentes	QT
CAF/SAF	00
Acumulado	00

Cronograma	Data Prevista
Início	28/10/2022
Término	28/11/2022

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL

SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RESPONSABILIDADES DE OBRA

MARIANA II

RELATÓRIO

Nº 06

Rev. 00

RELATÓRIO FINAL

SBCD CAMINHOS DE DAMASCO		CONTROLE DE GERENCIAMENTO DE OBRA		
Nome:	Função:	Empresa:	Contatos	
Rafael Takeo	Engenheiro Civil (Gestor de obras e Projetos)	SBCD - Caminhos de Damasco	(11) 00000-0000	zn.engenharia@sbcd.org.br
Lucas Salzano Carloto Marcondes	Projetista (Fiscalização de obras)	SBCD - Caminhos de Damasco	(11) 00000-0001	zn.projetos@sbcd.org.br

ARQUITETURA TOTAL		EMPREITEIRO DE EXECUÇÃO DE OBRA		
Nome:	Função:	Empresa:	Contatos	
Paola Brito	Arquiteta(Gestora de obras e projetos)	ARQUITETURA TOTAL	(11) 930777653	arquiteta@arquiteturatotal.com.br
Matheus Maiolli	Auxiliar de engenharia(Fiscalização e acompanhamento de obra)	ARQUITETURA TOTAL	(11)940493051	operacional@arquiteturatotal.com.br
Daniela Gomes	Arquiteta(Projetos)	ARQUITETURA TOTAL	(11)957781068	reforma@arquiteturatotal.com.br

ARQUITETURA TOTAL		TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO		
Nome:	Função:	Empresa:	Contatos	
Luciano Bazani	Técnico de segurança(Fiscalização de segurança das obras)	ARQUITETURA TOTAL	(11) 981739082	tecnicodeseguranca@arquiteturatotal.com.br

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RESUMO DE SERVIÇOS DE OBRA

MARIANA II

RELATÓRIO

Nº 06

Rev. 00

RELATÓRIO FINAL

Reparos do telhado/forro/elétrica e pintura

Local:	Serviço:	Empresa:	Status
Área externa	Troca pontual dos apoios do telhado	Arquitetura total	Finalizado
Área externa	Troca pontual do tipo telhas metálicas	Arquitetura total	Finalizado
Área interna	Reparos pontuais no forro de PVC	Arquitetura total	Finalizado
Área externa/interna	Reparos hidráulicos	Arquitetura total	Finalizado
Área interna	Troca de interruptores e tomadas	Arquitetura total	Finalizado
Área externa/interna	Reparos do quadro de luz e disjuntores	Arquitetura total	Finalizado
Área externa	Preparativos(como lixamento) e pintura geral externa	Arquitetura total	Finalizado
Área interna	Preparativos(como lixamento) e pintura geral interna	Arquitetura total	Finalizado
Área interna	Pintura pontual dos tetos, que estejam danificados	Arquitetura total	Finalizado
Área externa	Pintura pontual dos gradis externos, que estejam danificados	Arquitetura total	Finalizado

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL

SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

CRONOGRAMA DE OBRA

MARIANA II

RELATÓRIO

Nº 06

Rev. 00

RELATÓRIO FINAL

UNIDADE DE SAÚDE - MARIANA II



Início do projeto: 28/10/2022

Semana de exibição: 1

TAREFA	ATRIBUÍDO PARA	PROGRESSO	INÍCIO	TÉRMINO
REPAROS TELHADO				
Vistoria do madeiramento	CIVIL	100%	28/10/22	30/10/22
Troca pontual do madeiramento	CIVIL	100%	31/10/22	2/11/22
Vistoria das telhas tipo Metálicas	CIVIL	100%	2/11/22	7/11/22
Troca pontual das telhas tipo metálica	CIVIL	100%	7/11/22	9/11/22
REPAROS GERAIS				
Vistoria nas área de forro	CIVIL	100%	9/11/22	11/11/22
Reparos pontuais no forro de PVC existente	CIVIL	100%	11/11/22	14/11/22
substituição pontual do forro de PVC	CIVIL	100%	14/11/22	17/11/22
Pequenos reparos hidráulicos	HIDRÁULICA	100%	17/11/22	21/11/22

TAREFA	ATRIBUÍDO PARA	PROGRESSO	INÍCIO	TÉRMINO
ELÉTRICA				
Reparos em interruptores e tomadas	ELÉTRICA	100%	21/11/22	23/11/22
Reparos no Q.L e disjuntores	ELÉTRICA	100%	23/11/22	25/11/22
CLCB	ELÉTRICA	100%	25/11/22	28/11/22
SPDA	ELÉTRICA	100%	25/11/22	28/11/22
PINTURA				
Pintura geral externa	PINTURA	100%	3/11/22	14/11/22
Pintura geral interna	PINTURA	100%	7/11/22	21/11/22
Pintura pontual dos tetos, que estejam danificados	PINTURA	100%	14/11/22	28/11/22
Pintura pontual dos gradis externos, que estejam danifi	PINTURA	100%	17/11/22	27/11/22
Limpeza geral da obra	LIMPEZA	100%	25/11/22	28/11/22
Insira novas linhas ACIMA desta				
ENTREGA FINAL	ARQ.TOTAL	100%	28/11/22	28/11/22

EMPREENHEIRO: ARQUITETURA TOTAL

SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA


MARIANA II
RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 01

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área Interna	Preparo das salas internas, para receber a pintura.	ARQUITETURA TOTAL	De 28/10/2022	Ate 04/11/2022

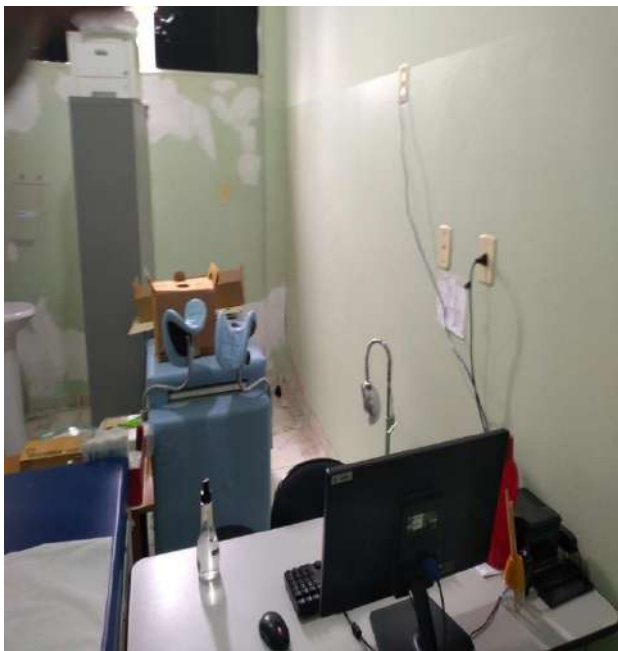

Preparo das salas internas, para receber a pintura.



Preparo das salas internas, para receber a pintura.



Preparo das salas internas, para receber a pintura.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

MARIANA II
RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 01

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área Interna	Preparo das salas internas, para receber a pintura.	ARQUITETURA TOTAL	De 28/10/2022	Ate 04/11/2022



Preparo das salas internas, para receber a pintura.



Preparo das salas internas, para receber a pintura.



Preparo das salas internas, para receber a pintura.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA


MARIANA II
RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 01

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área Interna	Preparo das salas internas, para receber a pintura.	ARQUITETURA TOTAL	De 28/10/2022	Ate 04/11/2022

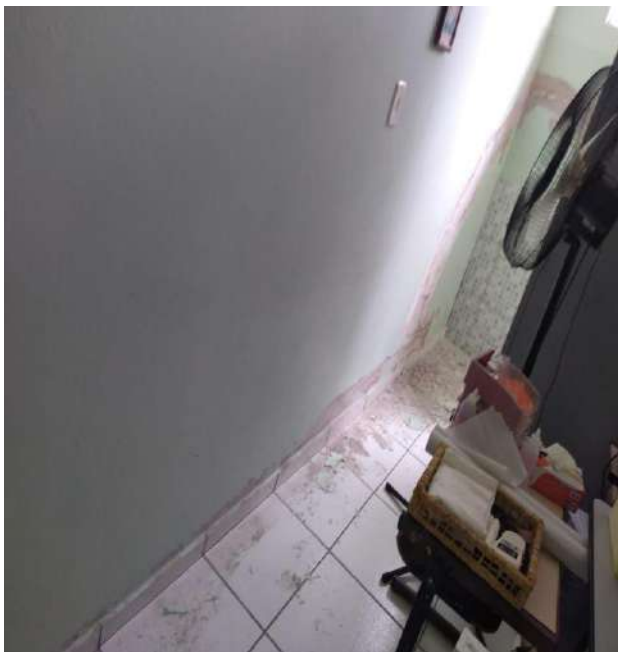

Preparo das salas internas, para receber a pintura.



Preparo das salas internas, para receber a pintura.



Preparo das salas internas, para receber a pintura.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

MARIANA II
RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 01

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área externa	Preparo externo para receber a pintura, tratamento das trincas e rachaduras com cimento.	ARQUITETURA TOTAL	De 28/10/2022	Ate 04/11/2022



Preparo externo para receber a pintura, tratamento das trincas e rachaduras com cimento.



Preparo externo para receber a pintura, tratamento das trincas e rachaduras com cimento.



Preparo externo para receber a pintura, tratamento das trincas e rachaduras com cimento.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

MARIANA II

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO


Nº 02

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área Interna	Primeira mão de tinta realizada na parte interna geral da unidade.	ARQUITETURA TOTAL	De 04/11/2022	Ate 11/11/2022



Primeira mão de tinta realizada nas salas internas da unidade.

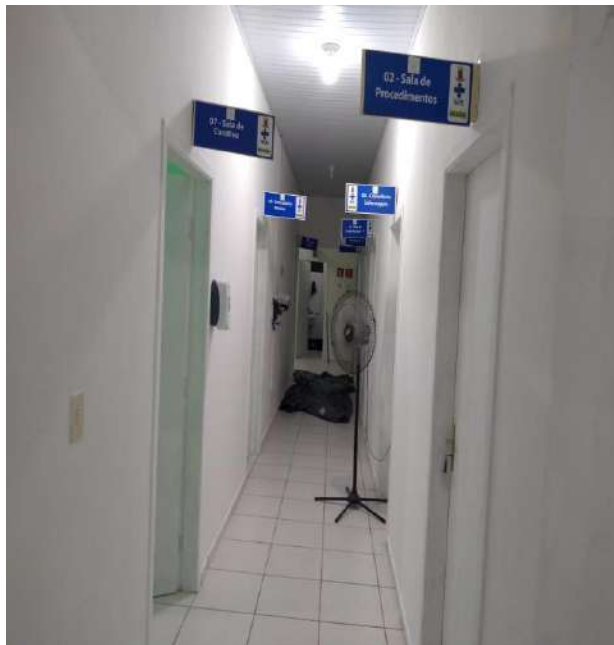

Primeira mão de tinta realizada nos corredores internos da unidade.



Primeira mão de tinta realizada nas salas internas da unidade.

EMPREENHEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

MARIANA II
RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 02

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área Interna	Primeira mão de tinta realizada na parte interna geral da unidade.	ARQUITETURA TOTAL	De 04/11/2022	Ate 11/11/2022



Primeira mão de tinta realizada nas salas internas da unidade.



Primeira mão de tinta realizada nos corredores internos da unidade.



Primeira mão de tinta realizada nas salas internas da unidade.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

MARIANA II

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 02

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área Interna/externa	Preparação da parte interna da recepção para a primeira mão de pintura e tratamento das rachaduras e trincas externas.	ARQUITETURA TOTAL	De 04/11/2022	Ate 11/11/2022



Preparação da parte interna da recepção para a primeira mão de pintura.



Tratamento das rachaduras e trincas externas.



Tratamento das rachaduras e trincas externas.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

MARIANA II
RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 03

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área Interna	Finalização da pintura interna da unidade.	ARQUITETURA TOTAL	De 11/11/2022	Ate 18/11/2022



Finalização da pintura interna da unidade.



Finalização da pintura interna da unidade.



Finalização da pintura interna da unidade.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

MARIANA II
RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 03

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área externa	Arremates finais na pintura externa e começo da instalação do SPDA .	ARQUITETURA TOTAL	De 11/11/2022	Ate 18/11/2022



Arremates finais na pintura externa e
começo da instalação do SPDA .



Arremates finais na pintura externa e
começo da instalação do SPDA .



Arremates finais na pintura externa e
começo da instalação do SPDA .

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

MARIANA II
RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 04

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área externa	Finalização do SPDA.	ARQUITETURA TOTAL	De 18/11/2022	Ate 25/11/2022



Finalização do SPDA.



Finalização do SPDA.



Finalização do SPDA.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

MARIANA II
RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 05

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área interna	Finalização da pintura do barramento cinza, das porta e paredes.	ARQUITETURA TOTAL	De 25/11/2022	Ate 02/12/2022



Finalização da pintura do barramento cinza, das porta e paredes.



Finalização da pintura do barramento cinza, das porta e paredes.



Finalização da pintura do barramento cinza, das porta e paredes.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

MARIANA II

RELATÓRIO

Nº 06

Rev. 00

RELATÓRIO FINAL

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área externa	Finalização da pintura externa.	ARQUITETURA TOTAL	De 02/12/2022	Ate 12/12/2022



Finalização da pintura externa.



Finalização da pintura externa.



Finalização da pintura externa.

EMPREENHEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

MARIANA II

RELATÓRIO

Nº 06

Rev. 00

RELATÓRIO FINAL

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área externa	Finalização da pintura externa.	ARQUITETURA TOTAL	De 02/12/2022	Ate 12/12/2022



Finalização da pintura externa.



Finalização da pintura externa.



Finalização da pintura externa.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

MARIANA II

RELATÓRIO

Nº 06

Rev. 00

RELATÓRIO FINAL

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área externa	Finalização da pintura externa.	ARQUITETURA TOTAL	De 02/12/2022	Ate 12/12/2022



Finalização da pintura externa.



Finalização da pintura externa.



Finalização da pintura externa.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

MARIANA II

RELATÓRIO

Nº 06

Rev. 00

RELATÓRIO FINAL

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área interna	Finalização da pintura interna.	ARQUITETURA TOTAL	De 02/12/2022	Ate 12/12/2022



Finalização da pintura interna.



Finalização da pintura interna.



Finalização da pintura interna.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

MARIANA II

RELATÓRIO

Nº 06


Rev. 00

RELATÓRIO FINAL

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área interna	Finalização da pintura interna.	ARQUITETURA TOTAL	De 02/12/2022	Ate 12/12/2022



Finalização da pintura interna.

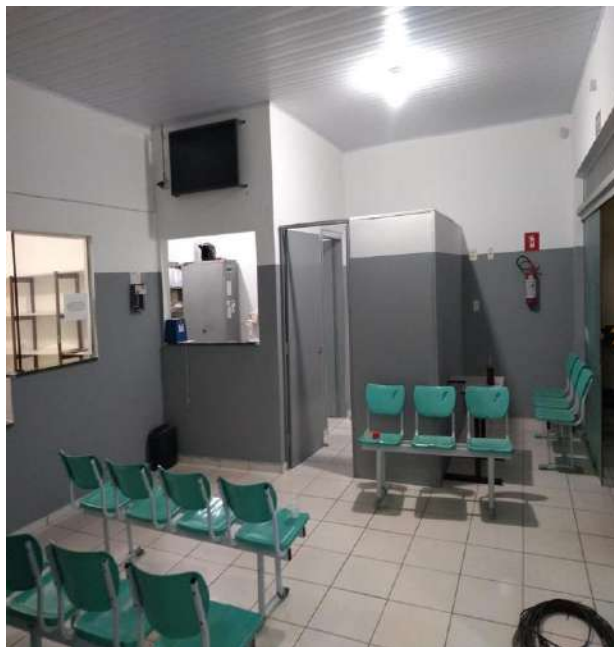

Finalização da pintura interna.



Finalização da pintura interna.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



BARROS-WILLIAMS



Sociedade Brasileira
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO

Nº 05

Rev. 00

RELATÓRIO FINAL

CONTROLE DE GERENCIAMENTO DE OBRA

UNIDADE: BARROS

Efetivo Médio	QT
Arquitetura total	04
-	00

Incidentes	QT
CAF/SAF	00
Acumulado	00

Cronograma	Data Prevista
Início	09/01/2023
Término	07/02/2023

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL

SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD

RESPONSABILIDADES DE OBRA

BARROS

RELATÓRIO

Nº 05

Rev. 00

SBCD CAMINHOS DE DAMASCO		CONTROLE DE GERENCIAMENTO DE OBRA		
Nome:	Função:	Empresa:	Contatos	
Rafael Takeo	Engenheiro Civil (Gestor de obras e Projetos)	SBCD - Caminhos de Damasco	(11) 00000-0000	zn.engenharia@sbcd.org.br
Lucas Salzano Carloto Marcondes	Projetista (Fiscalização de obras)	SBCD - Caminhos de Damasco	(11) 00000-0001	zn.projetos@sbcd.org.br
ARQUITETURA TOTAL		EMPREITEIRO DE EXECUÇÃO DE OBRA		
Nome:	Função:	Empresa:	Contatos	
Davi Cesar	Supervisor(Supervisão de obras)	ARQUITETURA TOTAL	(11) 920041659	supervisor@arquiteturatotal.com.br
Paola Brito	Arquiteta(Gestora)	ARQUITETURA TOTAL	(11) 930777653	arquiteta@arquiteturatotal.com.br
Matheus Maiolli	Auxiliar de engenharia(Fiscalização e acompanhamento de obra)	ARQUITETURA TOTAL	(11)940493051	operacional@arquiteturatotal.com.br
Daniela Gomes	Arquiteta(Projetos)	ARQUITETURA TOTAL	(11)957781068	reforma@arquiteturatotal.com.br
ARQUITETURA TOTAL		TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO		
Nome:	Função:	Empresa:	Contatos	
Luciano Bazani	Técnico de segurança(Fiscalização de segurança das obras)	ARQUITETURA TOTAL	(11) 981739082	tecnicodeseguranca@arquiteturatotal.com.br

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Brasileira
Caminho de Damasco - SBCD

RESUMO DE SERVIÇOS DE OBRA

BARROS

RELATÓRIO

Nº 05

Rev. 00

Reparos do telhado/elétrica e pintura

Local:	Serviço:	Empresa:	Status
Área externa	Troca pontual dos apoios do telhado	Arquitetura total	Finalizado
Área externa	Troca pontual do tipo telhas metálicas	Arquitetura total	Finalizado
Área interna	Reparos pontuais em ralos e etc.	Arquitetura total	Finalizado
Área externa/interna	Reparos hidráulicos	Arquitetura total	Finalizado
Área interna	Troca de interruptores e tomadas	Arquitetura total	Finalizado
Área externa/interna	Reparos do quadro de luz e disjuntores	Arquitetura total	Finalizado
Área externa	Preparativos(como lixamento) e pintura geral externa	Arquitetura total	Finalizado
Área interna	Preparativos(como lixamento) e pintura geral interna	Arquitetura total	Finalizado
Área interna	Pintura pontual dos tetos, que estejam danificados	Arquitetura total	Finalizado
Área externa	Pintura pontual dos gradis externos, que estejam danificados	Arquitetura total	Finalizado

EMPREENHEIRO: ARQUITETURA TOTAL

SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco - SBCD

CRONOGRAMA DE OBRA

BARROS

RELATÓRIO
Nº 01
Rev. 01

Observação

- Não foi possível iniciar totalmente a obra por conta das chuvas.
- A obra iniciou às 09/01/2023.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Brasileira
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

BARROS

RELATÓRIO

Nº 01

Rev. 01

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área interna	Foi realizado raspagem e quebra de concreto para a passagem de encanação.	ARQUITETURA TOTAL	De 09/01/2023	Ate 13/01/2023



Foi realizado raspagem para o começo da pintura.



Foi realizado quebra de concreto para a passagem de encanação.



Foi realizado quebra de concreto para a passagem de encanação.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Brasileira
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

BARROS

RELATÓRIO

Nº 02

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área externa.	Foi realizado pintura da área externa da unidade, incluindo os gradis.	ARQUITETURA TOTAL	De 13/01/2023	Ate 20/01/2023



Foi realizado pintura da área externa da unidade, incluindo os gradis.



Foi realizado pintura da área externa da unidade, incluindo os gradis.



Foi realizado pintura da área externa da unidade, incluindo os gradis.

EMPREENHEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Brasileira
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

BARROS

RELATÓRIO

Nº 02

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área interna.	Foi realizado a troca de tomadas, assentos sanitários e torneiras de lavatórios e tanques.	ARQUITETURA TOTAL	De 13/01/2023	Ate 20/01/2023



Foi realizado a troca de tomadas.



Foi realizado a troca de assentos sanitários.



Foi realizado a troca torneiras de lavatórios e tanques.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Brasileira
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

BARROS

RELATÓRIO

Nº 03

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área externa.	Foi realizado pintura da área externa da unidade, incluindo os gradis.	ARQUITETURA TOTAL	De 20/01/2023	Ate 27/01/2023



Foi realizado pintura da área externa da unidade, incluindo os gradis.



Foi realizado pintura da área externa da unidade, incluindo os gradis.



Foi realizado pintura da área externa da unidade, incluindo os gradis.

EMPREENHEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Brasileira
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

BARROS

RELATÓRIO

Nº 03

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área externa.	Foi realizado pintura da área externa da unidade, incluindo os gradis.	ARQUITETURA TOTAL	De 20/01/2023	Ate 27/01/2023



Foi realizado pintura da área externa da unidade, incluindo os gradis.



Foi realizado pintura da área externa da unidade, incluindo os gradis.



Foi realizado pintura da área externa da unidade, incluindo os gradis.

EMPREENHEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Brasileira
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

BARROS

RELATÓRIO

Nº 03

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área interna.	Foi realizado lixamento e emassamento, além de pintura de 10% das paredes gerais dos corredores.	ARQUITETURA TOTAL	De 20/01/2023	Ate 27/01/2023



Foi realizado lixamento e emassamento, além de pintura de 10% das paredes gerais dos corredores.



Foi realizado lixamento e emassamento, além de pintura de 10% das paredes gerais dos corredores.



Foi realizado lixamento e emassamento, além de pintura de 10% das paredes gerais dos corredores.

EMPREENHEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Brasileira
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRAFICO DE OBRA

BARROS

RELATÓRIO

Nº 04

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área externa.	Está em processo de finalização a pintura externa, e estamos em processo de finalização da parte interna também.	ARQUITETURA TOTAL	De 27/01/2023	Ate 03/02/2023



Está em processo de finalização a pintura externa, e estamos em processo de finalização da parte interna também.



Está em processo de finalização a pintura externa, e estamos em processo de finalização da parte interna também.



Está em processo de finalização a pintura externa, e estamos em processo de finalização da parte interna também.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Brasileira
Caminho de Damasco - SBCD

CRONOGRAMA DE OBRA BARROS

RELATÓRIO

Nº 05

Rev. 00

UNIDADE DE SAÚDE - BARROS



Início do projeto:

seg, 09/01/2023

Semana de exibição:

1

TAREFA	ATRIBUÍDO PARA	PROGRESSO	INÍCIO	TÉRMINO
REPAROS TELHADO				
Vistoria dos suportes do telhado	CIVIL	100%	9/1/23	23/1/23
Troca pontual dos suportes	CIVIL	100%	9/1/23	10/1/23
Vistoria das telhas tipo Metálicas	CIVIL	100%	10/1/23	11/1/23
Troca pontual das telhas tipo metálica	CIVIL	100%	11/1/23	12/1/23
REPAROS GERAIS				
Pequenos reparos hidráulicos	HIDRÁULICA	100%	17/1/23	21/1/23
ELÉTRICA				
Reparos em interruptores e tomadas pontuais	ELÉTRICA	100%	21/1/23	25/1/23
Reparos no Q.L e disjuntores	ELÉTRICA	100%	21/1/23	25/1/23
CLCB	ELÉTRICA	100%	19/12/22	30/1/23
SPDA	ELÉTRICA	100%	19/12/22	25/1/23

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL

SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Brasileira
Caminho de Damasco - SBCD

CRONOGRAMA DE OBRA BARROS

RELATÓRIO

Nº 05

Rev. 00

PINTURA					
Pintura geral externa	PINTURA	100%	20/1/23	3/2/23	
Pintura geral interna	PINTURA	100%	21/1/23	6/2/23	
Pintura pontual dos tetos, que estejam danificados	PINTURA	100%	21/1/23	6/2/23	
Pintura pontual dos gradis externos, que estejam danifi	PINTURA	100%	20/1/23	3/2/23	
Limpeza geral da obra	LIMPEZA	100%	25/1/23	6/2/23	
Linha de título de fase de exemplo					
Insira novas linhas ACIMA desta					
ENTREGA FINAL	ARQ.TOTAL	100%	7/2/23	7/2/23	

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD

CRONOGRAMA DE OBRA

BARROS

RELATÓRIO
Nº 05
Rev. 00

Observação

- Não há observações semanais.



Sociedade Brasileira
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

BARROS

RELATÓRIO

Nº 05

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área externa/Área interna.	Finalização da obra.	ARQUITETURA TOTAL	De 03/02/2023	Ate 10/02/2023



Finalização da obra.



Finalização da obra.



Finalização da obra.

EMPREENHEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Brasileira
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

BARROS

RELATÓRIO

Nº 05

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área externa/Área interna.	Finalização da obra.	ARQUITETURA TOTAL	De 03/02/2023	Ate 10/02/2023



Finalização da obra.



Finalização da obra.



Finalização da obra.

EMPREENHEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Brasileira
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

BARROS

RELATÓRIO

Nº 05

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área externa/Área interna.	Finalização da obra.	ARQUITETURA TOTAL	De 03/02/2023	Ate 10/02/2023



Finalização da obra.



Finalização da obra.



Finalização da obra.

EMPREENHEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Brasileira
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

BARROS

RELATÓRIO


Nº 05

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área externa/Área interna.	Finalização da obra.	ARQUITETURA TOTAL	De 03/02/2023	Ate 10/02/2023



Finalização da obra.

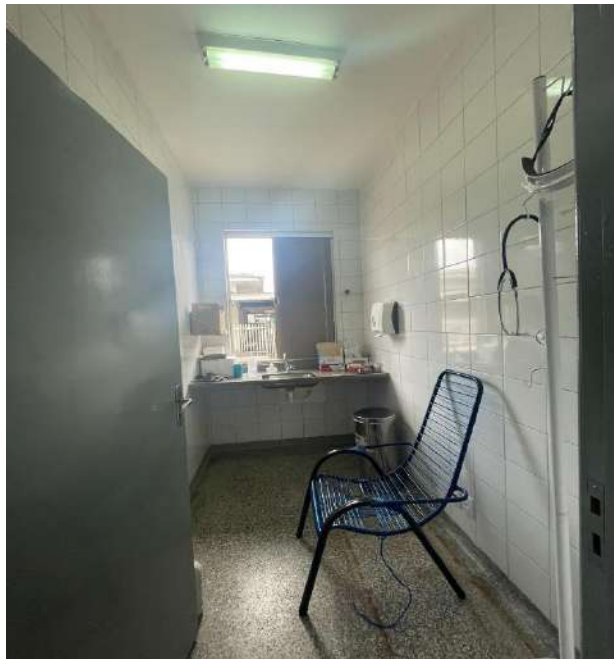

Finalização da obra.



Finalização da obra.

EMPREENHEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Brasileira
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

BARROS

RELATÓRIO

Nº 05

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área externa/Área interna.	Finalização da obra.	ARQUITETURA TOTAL	De 03/02/2023	Ate 10/02/2023



Finalização da obra.



Finalização da obra.



Finalização da obra.

EMPREENHEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



ARACELLI

CONTROLE DE GERENCIAMENTO DE OBRA

UNIDADE: ARACELLI

RELATÓRIO FINAL

Efetivo Médio	QT
Arquitetura total	04
-	00

Incidentes	QT
CAF/SAF	00
Acumulado	00

Cronograma	Data Prevista
Início	25/04/2023
Término	25/05/2023

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL

SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD

RESPONSABILIDADES DE OBRA

ARACELLI
RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 06

Rev. 00

SBCD CAMINHOS DE DAMASCO		CONTROLE DE GERENCIAMENTO DE OBRA		
Nome:	Função:	Empresa:	Contatos	
Rafael Takeo	Engenheiro Civil (Gestor de obras e Projetos)	SBCD - Caminhos de Damasco	(11) 00000-0000	zn.engenharia@sbcd.org.br
Lucas Salzano Carloto Marcondes	Projetista (Fiscalização de obras)	SBCD - Caminhos de Damasco	(11) 00000-0001	zn.projetos@sbcd.org.br
ARQUITETURA TOTAL		EMPREITEIRO DE EXECUÇÃO DE OBRA		
Nome:	Função:	Empresa:	Contatos	
Davi Cesar	Supervisor(Supervisão de obras)	ARQUITETURA TOTAL	(11) 920041659	supervisor@arquiteturatotal.com.br
Paola Brito	Arquiteta(Gestora)	ARQUITETURA TOTAL	(11) 930777653	arquiteta@arquiteturatotal.com.br
Matheus Maiolli	Auxiliar de engenharia(Fiscalização e acompanhamento de obra)	ARQUITETURA TOTAL	(11)940493051	operacional@arquiteturatotal.com.br
Daniela Gomes	Arquiteta(Projetos)	ARQUITETURA TOTAL	(11)957781068	reforma@arquiteturatotal.com.br
ARQUITETURA TOTAL		TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO		
Nome:	Função:	Empresa:	Contatos	
Luciano Bazani	Técnico de segurança(Fiscalização de segurança das obras)	ARQUITETURA TOTAL	(11) 981739082	tecnicodeseguranca@arquiteturatotal.com.br

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL

SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD

RESUMO DE SERVIÇOS DE OBRA

ARACELLI

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 06

Rev. 00

Reparos do telhado/hidráulico e pintura

Local:	Serviço:	Empresa:	Status
Área externa	Vistoria dos suportes do telhado	Arquitetura total	Finalizado
Área externa	Troca total das estruturas do telhado	Arquitetura total	Finalizado
Área externas	Vistoria das telhas	Arquitetura total	Finalizado
Área externa	Troca total das telhas de fibrocimento	Arquitetura total	Finalizado
Área externa	Pequenos reparos civil externo	Arquitetura total	Finalizado
Área externa/interna	Pequenos reparos hidráulicos	Arquitetura total	Finalizado
Área interna	CLCB	Arquitetura total	Finalizado
Área externa	SPDA	Arquitetura total	Finalizado
Área externa	Pintura geral externa	Arquitetura total	Finalizado
Área interna	Pintura geral interna	Arquitetura total	Finalizado
Área interna	Pintura pontual dos tetos, que estejam danificados	Arquitetura total	Finalizado
Área interna/Externa	Limpeza geral da obra	Arquitetura total	Finalizado

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL

SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Brasileira
Caminho de Damasco - SBCD

CRONOGRAMA DE OBRA

ARACELLI

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 06

Rev. 00

UNIDADE DE SAÚDE - ARACELLI



Início do projeto:

ter, 25/04/2023

Semana de exibição:

1

TAREFA	ATRIBUÍDO PARA	PROGRESSO	INÍCIO	TÉRMINO
TROCA DA COBERTURA				
Vistoria dos suportes do telhado	TELHADO	100%	1/5/23	1/5/23
Troca total das estruturas do telhado	TELHADO	100%	1/5/23	7/5/23
Vistoria das telhas	TELHADO	100%	2/5/23	2/5/23
Troca total das telhas de fibrocimento	TELHADO	100%	7/5/23	14/5/23
REPAROS GERAIS				
Pequenos reparos civil externo	CIVIL	100%	25/4/23	30/4/23
Pequenos reparos hidráulicos	HIDRÁULICA	100%	25/4/23	30/4/23

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Brasileira
Caminho de Damasco - SBCD

CRONOGRAMA DE OBRA

ARACELLI

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 06

Rev. 00

SPDA				
CLCB	ELÉTRICA	100%	21/5/23	25/5/23
SPDA	ELÉTRICA	100%	21/5/23	25/5/23
PINTURA				
Pintura geral externa	PINTURA	100%	15/5/23	25/5/23
Pintura geral interna	PINTURA	100%	15/5/23	25/5/23
Pintura pontual dos tetos, que estejam danificados	PINTURA	100%	15/5/23	25/5/23
Limpeza geral da obra	LIMPEZA	100%	24/5/23	25/5/23
ENTREGA FINAL	ARQ.TOTAL	100%	25/5/23	25/5/23

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD

CRONOGRAMA DE OBRA

ARACELLI

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO
Nº 06
Rev. 00

Observação

- Não há observações semanais.



Sociedade Brasileira
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

ARACELLI

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 06

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área interna	Foi realizada a finalização da obra.	ARQUITETURA TOTAL	De 26/05/2023	Ate 30/05/2023



Foi realizada a finalização da obra.



Foi realizada a finalização da obra.



Foi realizada a finalização da obra.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Brasileira
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

ARACELLI

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 06

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área externa	Foi realizada a finalização da obra.	ARQUITETURA TOTAL	De 26/05/2023	Ate 30/05/2023



Foi realizada a finalização da obra.



Foi realizada a finalização da obra.



Foi realizada a finalização da obra.

EMPREENHEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



PALERMO I E II

CONTROLE DE GERENCIAMENTO DE OBRA

UNIDADE: PALERMO I E II

Efetivo Médio	QT
Arquitetura total	04
-	00

Incidentes	QT
CAF/SAF	00
Acumulado	00

Cronograma	Data Prevista
Início	19/06/2023
Término	20/07/2023

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL

SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Brasileira
Caminho de Damasco - SBCD

RESPONSABILIDADES DE OBRA

PALERMO I E II

RELATÓRIO

Nº 08

Rev. 00

SBCD CAMINHOS DE DAMASCO		CONTROLE DE GERENCIAMENTO DE OBRA		
Nome:	Função:	Empresa:	Contatos	
Rafael Takeo	Gerente de Engenharia	SBCD - Caminhos de Damasco	(11) 00000-0000	Rafael.takeo@sbcd.org.br
Francisreis Lima	Engenheiro Civil	SBCD - Caminhos de Damasco	(11) 00000-0001	zn.engenharia@sbcd.org.br
Lucas Salzano Carloto Marcondes	Projetista	SBCD - Caminhos de Damasco	(11) 00000-0002	zn.projetos@sbcd.org.br
ARQUITETURA TOTAL		EMPREITEIRO DE EXECUÇÃO DE OBRA		
Nome:	Função:	Empresa:	Contatos	
Davi Cesar	Supervisor(Supervisão de obras)	ARQUITETURA TOTAL	(11) 920041659	supervisor@arquiteturatotal.com.br
Paola Brito	Arquiteta(Gestora)	ARQUITETURA TOTAL	(11) 930777653	arquiteta@arquiteturatotal.com.br
Matheus Maiolli	Auxiliar de engenharia(Fiscalização e acompanhamento de obra)	ARQUITETURA TOTAL	(11)940493051	operacional@arquiteturatotal.com.br
Daniela Gomes	Arquiteta(Projetos)	ARQUITETURA TOTAL	(11)957781068	reforma@arquiteturatotal.com.br
ARQUITETURA TOTAL		TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO		
Nome:	Função:	Empresa:	Contatos	
Luciano Bazani	Técnico de segurança(Fiscalização de segurança das obras)	ARQUITETURA TOTAL	(11) 981739082	tecnicodeseguranca@arquiteturatotal.com.br

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL

SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Brasileira
Caminho de Damasco - SBCD

RESUMO DE SERVIÇOS DE OBRA

PALERMO I E II

RELATÓRIO

Nº 08

Rev. 00

Reparos do telhado/hidráulico e pintura

Local:	Serviço:	Empresa:	Status
Área externa	Vistoria dos suportes do telhado	Arquitetura total	Finalizado
Área externa	Troca pontual das estruturas do telhado	Arquitetura total	Finalizado
Área externas	Vistoria das telhas	Arquitetura total	Finalizado
Área externa	Troca pontual das telhas	Arquitetura total	Finalizado
Área externa	Troca total dos beirais do telhado(Fechamento externo)	Arquitetura total	Finalizado
Área interna	CLCB	Arquitetura total	Finalizado
Área externa	SPDA	Arquitetura total	Em andamento
Área externa	Pintura geral externa(Paredes e Portas)	Arquitetura total	Finalizado
Área interna/Externa	Limpeza geral da obra	Arquitetura total	Finalizado

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL

SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Brasileira
Caminho de Damasco - SBCD

CRONOGRAMA DE OBRA

PALERMO I E II

RELATÓRIO

Nº 08

Rev. 00

UNIDADE DE SAÚDE - PALERMO I E II



Início do projeto:

seg, 19/06/2023

Semana de exibição:

1

TAREFA	ATRIBUÍDO PARA	PROGRESSO	INÍCIO	TÉRMINO
MANUTENÇÃO DO TELHADO				
Vistoria dos suportes do telhado	TELHADO	100%	20/6/23	20/6/23
Troca pontual das estruturas do telhado	TELHADO	100%	21/6/23	26/6/23
Vistoria das telhas	TELHADO	100%	27/6/23	27/6/23
Troca pontual das telhas	TELHADO	100%	28/6/23	14/7/23
troca total dos beirais do telhado(fechamento externo)	TELHADO	100%	19/6/23	16/7/23
SPDA				
CLCB	ELÉTRICA	100%	20/6/23	20/7/23
SPDA	ELÉTRICA	50%	20/6/23	20/7/23
PINTURA E REPAROS GERAIS				
Pintura geral externa(Paredes e portas)	PINTURA	100%	17/6/23	17/7/23
Limpeza geral da obra	LIMPEZA	100%	19/7/23	19/7/23
ENTREGA FINAL	ARQ. TOTAL	94%	20/7/23	20/7/23

EMPREENHEIRO: ARQUITETURA TOTAL

SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD

CRONOGRAMA DE OBRA

PALERMO I E II

RELATÓRIO
Nº 08
Rev. 00

Observação

- A obra finalizou a parte de pintura e demais itens, faltando apenas a conclusão do SPDA, serviço esse que não afeta o funcionamento geral da unidade.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Brasileira
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

PALERMO I E II

RELATÓRIO

Nº 08

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área externa	Foi realizado a finalização de pintura externa.	ARQUITETURA TOTAL	De 04/08/2023	Ate 11/08/2023



Foi realizado a finalização de pintura externa.



Foi realizado a finalização de pintura externa.



Foi realizado a finalização de pintura externa.

EMPREENHEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Brasileira
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

PALERMO I E II

RELATÓRIO

Nº 08

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área externa	Foi realizado a finalização de pintura externa.	ARQUITETURA TOTAL	De 04/08/2023	Ate 11/08/2023



Foi realizado a finalização de pintura externa.



Foi realizado a finalização de pintura externa.



Foi realizado a finalização de pintura externa.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



REGIÃO OESTE

CONTROLE DE GERENCIAMENTO DE OBRA

UNIDADE: REGIÃO OESTE

RELATÓRIO FINAL

Efetivo Médio	QT
Arquitetura total	04
-	00

Incidentes	QT
CAF/SAF	00
Acumulado	00

Cronograma	Data Prevista
Início	26/06/2023
Término	26/07/2023

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL

SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD

RESPONSABILIDADES DE OBRA

REGIÃO OESTE RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 02

Rev. 00

SBCD CAMINHOS DE DAMASCO		CONTROLE DE GERENCIAMENTO DE OBRA		
Nome:	Função:	Empresa:	Contatos	
Rafael Takeo	Gerente de Engenharia	SBCD - Caminhos de Damasco	(11) 00000-0000	Rafael.takeo@sbcd.org.br
Francisreis Lima	Engenheiro Civil	SBCD - Caminhos de Damasco	(11) 00000-0001	zn.engenharia@sbcd.org.br
Lucas Salzano Carloto Marcondes	Projetista	SBCD - Caminhos de Damasco	(11) 00000-0002	zn.projetos@sbcd.org.br
ARQUITETURA TOTAL		EMPREITEIRO DE EXECUÇÃO DE OBRA		
Nome:	Função:	Empresa:	Contatos	
Davi Cesar	Supervisor(Supervisão de obras)	ARQUITETURA TOTAL	(11) 920041659	supervisor@arquiteturatotal.com.br
Paola Brito	Arquiteta(Gestora)	ARQUITETURA TOTAL	(11) 930777653	arquiteta@arquiteturatotal.com.br
Matheus Maiolli	Auxiliar de engenharia(Fiscalização e acompanhamento de obra)	ARQUITETURA TOTAL	(11)940493051	operacional@arquiteturatotal.com.br
Daniela Gomes	Arquiteta(Projetos)	ARQUITETURA TOTAL	(11)957781068	reforma@arquiteturatotal.com.br
ARQUITETURA TOTAL		TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO		
Nome:	Função:	Empresa:	Contatos	
Luciano Bazani	Técnico de segurança(Fiscalização de segurança das obras)	ARQUITETURA TOTAL	(11) 981739082	tecnicodeseguranca@arquiteturatotal.com.br

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL

SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD

RESUMO DE SERVIÇOS DE OBRA

REGIÃO OESTE

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 02

Rev. 00

Reparos do telhado/elétrica e pintura

Local:	Serviço:	Empresa:	Status
Área externa	Troca pontual dos apoios do telhado	Arquitetura total	Finalizado
Área externa	Troca pontual do tipo telhas romanas	Arquitetura total	Finalizado
Área interna	Reparos pontuais em ralos e etc.	Arquitetura total	Finalizado
Área externa/interna	Reparos hidráulicos	Arquitetura total	Finalizado
Área interna	Troca de interruptores e tomadas	Arquitetura total	Finalizado
Área externa/interna	Reparos do quadro de luz e disjuntores	Arquitetura total	Finalizado
Área externa	Preparativos(como lixamento) e pintura geral externa	Arquitetura total	Finalizado
Área interna	Preparativos(como lixamento) e pintura geral interna	Arquitetura total	Finalizado
Área interna	Pintura pontual dos tetos, que estejam danificados	Arquitetura total	Finalizado
Área externa	Pintura pontual dos gradis externos, que estejam danificados	Arquitetura total	Finalizado

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL

SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Brasileira
Caminho de Damasco - SBCD

CRONOGRAMA DE OBRA

REGIÃO OESTE

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 02

Rev. 00

UNIDADE DE SAÚDE - REGIÃO OESTE



Início do projeto:

seg, 26/06/2023

Semana de exibição:

1

TAREFA	ATRIBUÍDO PARA	PROGRESSO	INÍCIO	TÉRMINO
REPAROS NO TELHADO				
Vistoria do madeiramento	TELHADO	100%	26/6/23	27/6/23
Troca pontual do madeiramento	TELHADO	100%	27/6/23	29/6/23
Vistoria das telhas	TELHADO	100%	29/6/23	30/6/23
Troca pontual das telhas	TELHADO	100%	30/6/23	2/7/23
REPAROS GERAIS				
Vistória nas áreas de forro	CIVIL	100%	2/7/23	3/7/23
Reparos pontuais no forro de PVC existente	CIVIL	100%	3/7/23	7/7/23
Substituição pontual do forro PVC	CIVIL	100%	7/7/23	10/7/23
Pequenos reparos hidráulicos	HIDRÁULICA	100%	10/7/23	12/7/23

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL

SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Brasileira
Caminho de Damasco - SBCD

CRONOGRAMA DE OBRA

REGIÃO OESTE

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 02

Rev. 00

ELÉTRICA					
Reparos em interruptores e tomadas	ELÉTRICA	100%	10/7/23	12/7/23	
Reparos no Q.L e disjuntores	ELÉTRICA	100%	12/7/23	14/7/23	
CLCB	ELÉTRICA	100%	26/6/23	20/7/23	
SPDA	ELÉTRICA	100%	26/6/23	20/7/23	
PINTURA					
Pintura geral externa	PINTURA	100%	28/6/23	20/7/23	
Pintura geral interna	PINTURA	100%	3/7/23	22/7/23	
Pintura pontual dos tetos, que estejam danificados	PINTURA	100%	28/6/23	20/7/23	
Pintura pontual dos gradis externos, que estejam danificados	PINTURA	100%	3/7/23	22/7/23	
Limpeza geral da obra	LIMPEZA	100%	23/7/23	25/7/23	
ENTREGA FINAL	ARQ.TOTAL	100%	26/7/23	26/7/23	

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL

SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD

CRONOGRAMA DE OBRA

REGIÃO OESTE

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO
Nº 02
Rev. 00

Observação

- Não há observações semanais.



Sociedade Brasileira
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

REGIÃO OESTE

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 02

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área interna	Finalização da obra.	ARQUITETURA TOTAL	De 30/06/2023	Ate 07/07/2023



Finalização da obra.



Finalização da obra.



Finalização da obra.

EMPREITEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD



Sociedade Brasileira
Caminho de Damasco - SBCD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

REGIÃO OESTE

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO

Nº 02

Rev. 00

Local:	Serviços:	Empresa:	Período	
Área externa	Finalização da obra.	ARQUITETURA TOTAL	De 30/06/2023	Ate 07/07/2023



Finalização da obra.



Finalização da obra.



Finalização da obra.

EMPREENHEIRO: ARQUITETURA TOTAL
SUPERVISÃO: ENGENHARIA SBCD
